

GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA


Obra: PRODIMDF 001/19 Acondicionamiento de Espacio Físico de la Dirección de Desarrollo Social, Económico y Agropecuario (2 Etapa)

Ubicación: CABECERA MUNICIPAL
Tipo de inversión: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México

Contrato: FISMDF 007/19
Contratista: I.C. Cesar Alexis Muñoz Gómez
Inicio Vigente: miércoles, 17 de julio de 2019
Inicio Real: miércoles, 17 de julio de 2019
Fin Vigente: jueves, 15 de agosto de 2019
Fin Real: jueves, 15 de agosto de 2019

Días de Obra: 15 días
Monto Contratado: \$ 106,894.96
Monto Ejercido: \$ 106,894.96

| SEMANA | FECHA | %AVANCE FISICO PROG | %AVANCE FISICO REAL | %AVANCE Financiero |
|--------|------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 1 | 23/07/2019 | 3.81% | 5.00% | 0% |
| 2 | 30/07/2019 | 14.66% | 18.00% | 0% |
| 3 | 06/08/2019 | 25.51% | 32.00% | 0% |
| 4 | 13/08/2019 | 68.84% | 78.00% | 0% |
| 5 | 20/08/2019 | 100.00% | 100.00% | 0% |
| 6 | 27/08/2019 | 100.00% | 100.00% | 100% |

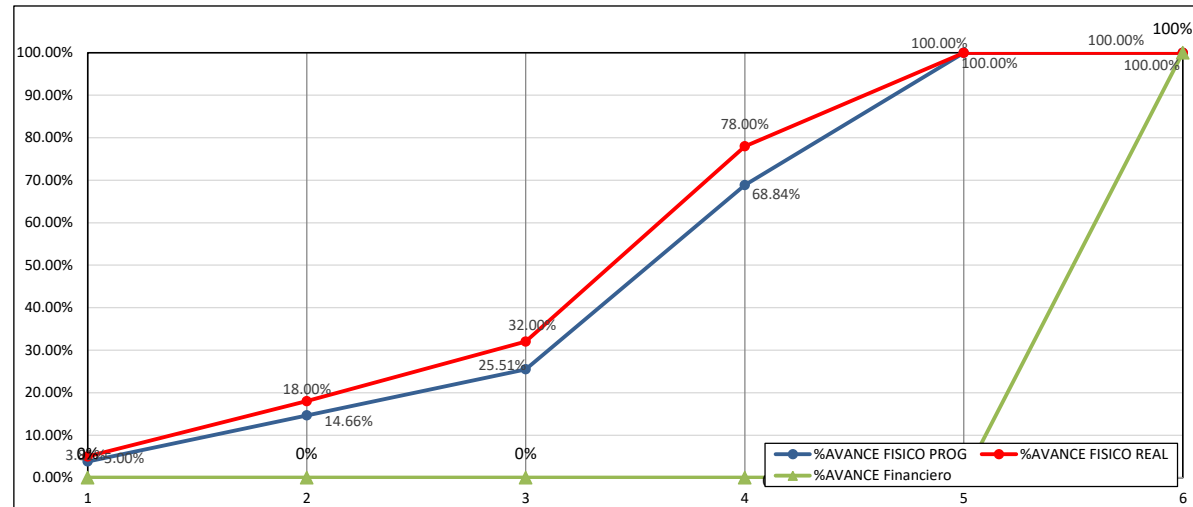

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
