

GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA

Obra: FIS MDF 11-005 CONSTRUCCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS.-ZON SUR DEL MUNICIPIO

Ubicación: ZONA SUR DEL MUNICIPIO.- (COL. 28 DE ABRIL, ESTACION CHICALOTE, LA CASITA, LA CONCEPCION, LA GUAYANA, LA ESCONDIDA, LORTITO, MACARIO J. GOMEZ, PUERTECITO DE LA VIRGEN Y VIÑEDOS RIBIER).

Tipo de inversión: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México

Programa: SH Vivienda Digna

Subprograma: 02 b) Ampliación de Vivienda

Residente: T.C. FERNANDO LUNA MEDINA

Contrato: FIS MDF 009/19

Contratista: OLDA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

Inicio Vigente: miércoles, 7 de agosto de 2019

Inicio Real: miércoles, 7 de agosto de 2019

Fin Vigente: martes, 19 de noviembre de 2019


Fin Real:

Días de Obra: 105 días

Monto Contratado: \$ 3,257,912.87

Monto Ejercido:

SEMANA	FECHA	%AVANCE FISICO PROG	%AVANCE FISICO REAL	%AVANCE Financiero
1	12/08/2019	1.06%	1.50%	50%
2	19/08/2019	8.16%	8.50%	50%
3	26/08/2019	19.52%	20.00%	50%
4	02/09/2019	36.26%	37.00%	50%
5	09/09/2019	50.55%	52.00%	50%
6	16/09/2019	62.65%	65.00%	50%
7	23/09/2019	70.16%	70.50%	50%
8	30/09/2019	78.15%	79.00%	50%
9	07/10/2019	81.22%		
10	14/10/2019	88.55%		
11	21/10/2019	92.72%		
12	28/10/2019	92.77%		
13	04/11/2019	96.35%		
14	11/11/2019	99.27%		
15	18/11/2019	99.90%		
16	25/11/2019	100.00%		

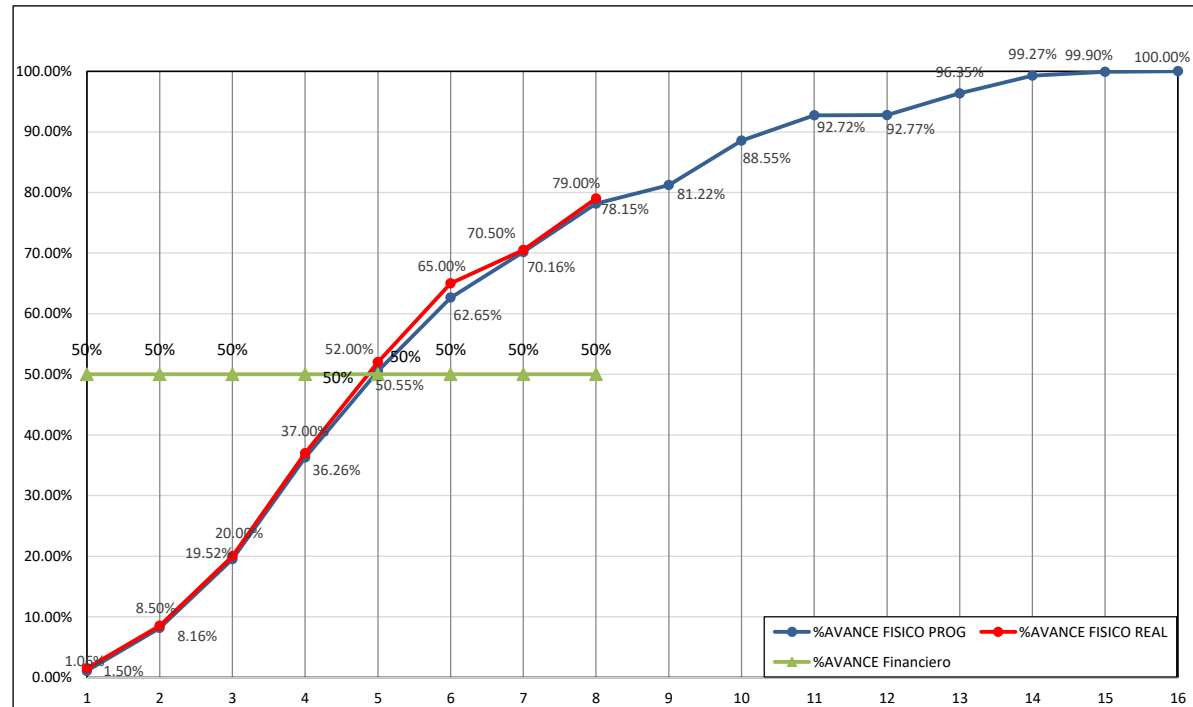

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
