

GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA

Obra: DM 008/19 – FISDMF 11-006/19 Construcción de Techumbre en Área de Impartición de Educación Física en el Centro de Atención Múltiple (CAM XVI),

Ubicación: CABECERA MUNICIPAL

Tipo de inversión: Directo Municipal / Fondo para la Infraestructura Social Municipal y las Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México (FISDMF)

Programa: SJ Infraestructura Educativa

Subprograma: 02 d) Construcción – Otros Niveles

Residente: ING. J. JESÚS HERNANDEZ FUENTES

Contrato: FISDMF 010/19

Contratista: Proyectos y Construcciones JE de la Peña en Aguascalientes, S.A. de C.V.

Inicio Vigente: viernes, 6 de septiembre de 2019

Inicio Real: viernes, 6 de septiembre de 2019

Fin Vigente: sábado, 5 de octubre de 2019


Fin Real:

Días de Obra: 30 días

Monto Contratado: \$ 533,106.49

Monto Ejercido:

SEMANA	FECHA	%AVANCE FISICO PROG	%AVANCE FISICO REAL	%AVANCE Financiero
1	09/09/2019	4.70%	5.50%	50%
2	16/09/2019	23.33%	25.00%	50%
3	23/09/2019	43.66%	48.00%	50%
4	30/09/2019	93.63%	95.00%	50%
5	07/10/2019	100.00%		

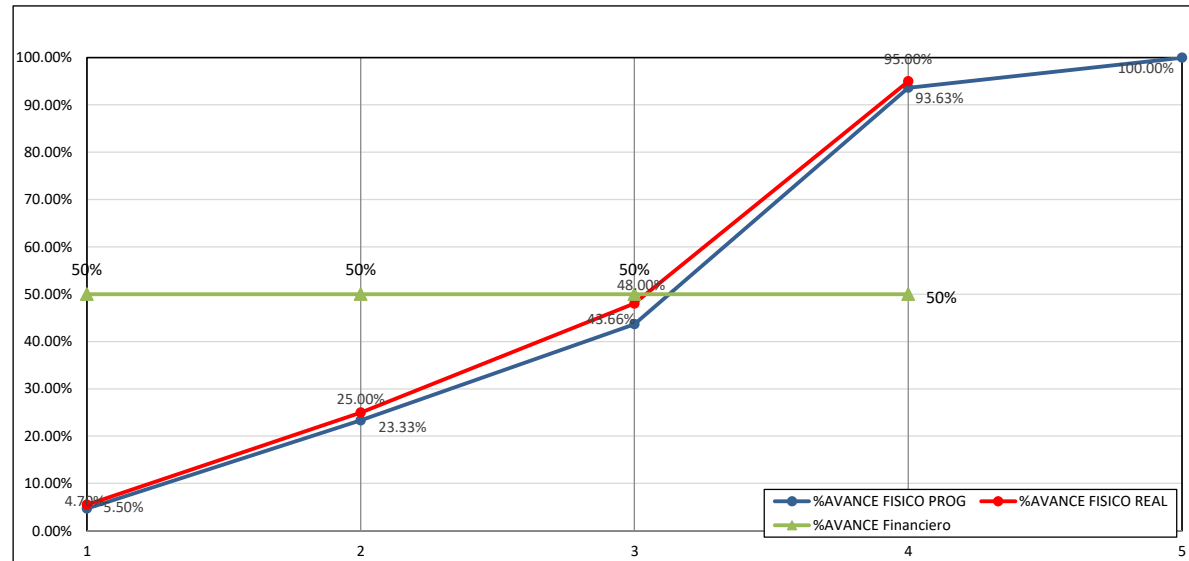

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
