

GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA


Obra: COM 001/19 Rehabilitación de Colector Sanitario

Ubicación: El Panzazo
Tipo de inversión: Convenio Organismo Operador del Agua y Municipio de San Francisco de los Romo
Programa: SD Alcatarillado
Subprograma: 01 Rehabilitación
Residente: T.C. FERNANDO LUNA MEDINA

Contrato: COM 001/19
Contratista: C. Ing. Roberto Silva Arjón
Inicio Vigente: jueves, 26 de septiembre de 2019
Inicio Real: jueves, 26 de septiembre de 2019
Fin Vigente: domingo, 24 de noviembre de 2019
Fin Real: domingo, 24 de noviembre de 2019

Días de Obra: 60 días
Monto Contratado: \$ 1,302,591.53
Monto Ejercido: \$ 1,302,591.53

SEMANA	FECHA	%AVANCE FISICO PROG	%AVANCE FISICO REAL	%AVANCE Financiero
1	30/09/2019	11.64%	15.00%	66%
2	07/10/2019	16.18%	18.00%	66%
3	14/10/2019	21.74%	22.00%	66%
4	21/10/2019	33.06%	35.00%	66%
5	28/10/2019	61.88%	63.00%	66%
6	04/11/2019	75.88%	78.00%	66%
7	11/11/2019	75.41%	79.00%	66%
8	18/11/2019	84.00%	85.00%	66%
9	25/11/2019	100.00%	100.00%	66%
10	02/12/2019	100.00%	100.00%	100%

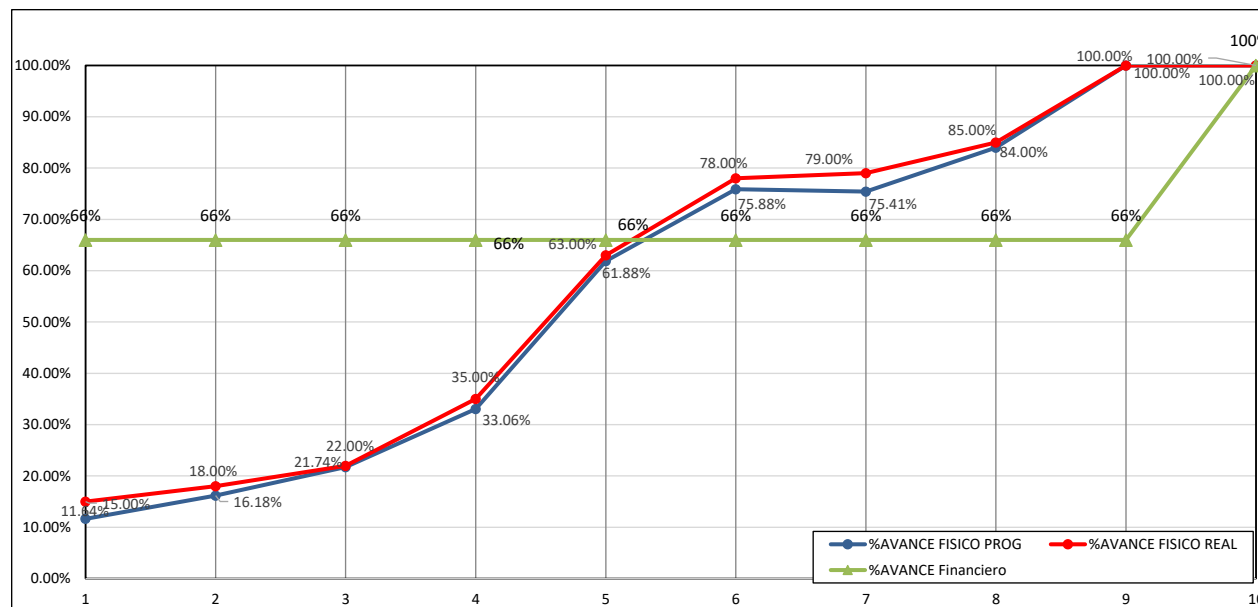

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
