


GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA

Obra: DM 003 REHABILITACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA MIGUEL HIDALGO	Contrato: DM 004/19	Días de Obra: 60 días
Ubicación: FRACC. MIGUEL HIDALGO	Contratista: Mags Construcciones, S.A. de C.V.	Monto Contratado: \$1,467,000.00
Tipo de inversión: Fondo Directo Municipal 2019	Inicio Vigente: martes, 14 de mayo de 2019	Monto Ejercido: \$1,467,000.00
Programa: SE URBANIZACION	Inicio Real: martes, 14 de mayo de 2019	
Subprograma: 07, a) PARQUES Y JARDINES - REHABILITACIÓN	Fin Vigente: viernes, 12 de julio de 2019	
Residente: I.C. Carlos Armando Chávez García	Fin Real: viernes, 12 de julio de 2019	

SEMANA	FECHA	%AVANCE FISCO PROG	%AVANCE FISCO REAL	%AVANCE Financiero
1	20/05/2019	1.11%	2.50%	50.0%
2	27/05/2019	7.05%	10.00%	50.0%
3	03/06/2019	14.75%	18.00%	50.0%
4	10/06/2019	29.01%	35.00%	50.0%
5	17/06/2019	45.11%	44.00%	50.0%
6	24/06/2019	60.95%	61.00%	50.0%
7	01/07/2019	80.59%	81.70%	74.0%
8	08/07/2019	97.75%	98.00%	74.0%
9	15/07/2019	100.00%	100.00%	74.0%
10	22/07/2019	100.00%	100.00%	90.0%
11	29/07/2019	100.00%	100.00%	90.0%
12	05/08/2019	100.00%	100.00%	90.0%
13	12/08/2019	100.00%	100.00%	98.6%
14	19/08/2019	100.00%	100.00%	100%

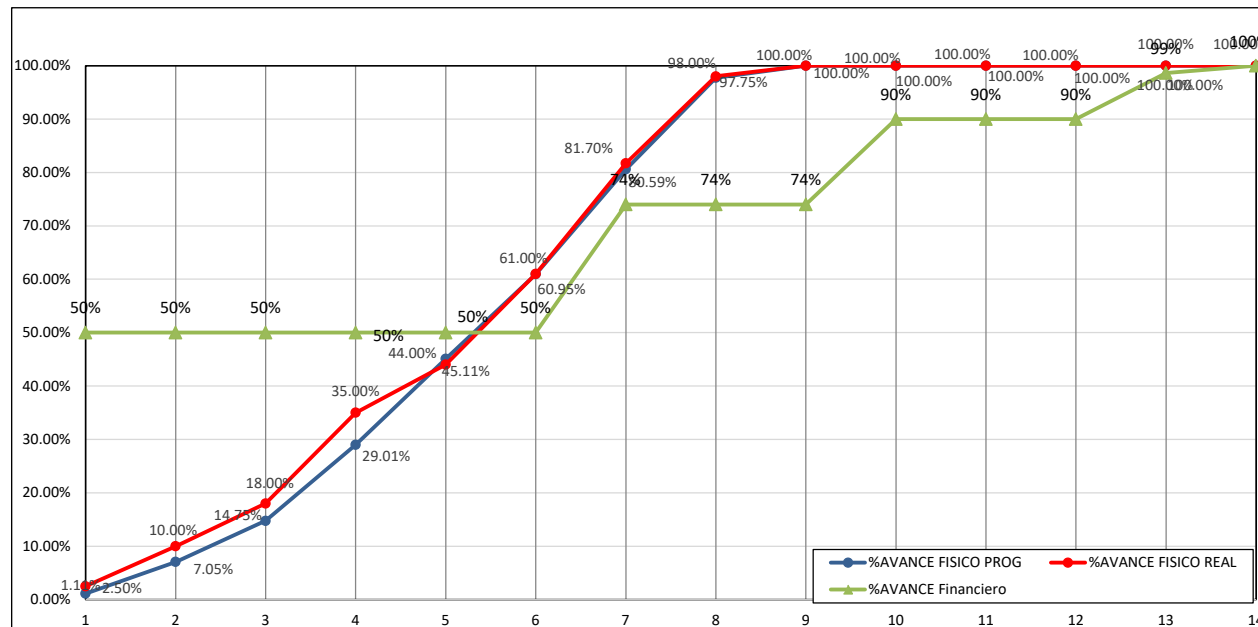

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
