

GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA

Obra: DM 004/19 REHABILITACIÓN DE PARQUE URBANO 1 er ETAPA, CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE

Ubicación: LA ESCONDIDA

Contrato: DM 005/19

Tipo de inversión: Fondo Directo Municipal 2019

Contratista: GCT Bajío Construcciones, S.A. de C.V

Programa: SE URBANIZACION

Inicio Vigente: viernes, 3 de mayo de 2019

Días de Obra: 60 días

Subprograma: 07, a) PARQUES Y JARDINES - REHABILITACIÓN

Inicio Real: viernes, 3 de mayo de 2019

Monto Contratado: \$ 1,321,018.36


Residente: I.C. Carlos Armando Chávez García

Fin Vigente: lunes, 1 de julio de 2019

Monto Ejercido: \$ 1,321,018.35

Fin Real: lunes, 1 de julio de 2019

SEMANA	FECHA	%AVANCE FISICO PROG	%AVANCE FISICO REAL	%AVANCE Financiero
1	06/05/2019	1.68%	3.00%	50.0%
2	13/05/2019	9.56%	10.00%	50.0%
3	20/05/2019	20.28%	23.50%	50.0%
4	27/05/2019	34.11%	40.50%	50.0%
5	03/06/2019	47.94%	55.80%	67.0%
6	10/06/2019	61.77%	70.00%	67.0%
7	17/06/2019	91.30%	94.00%	67.0%
8	24/06/2019	96.00%	97.00%	91.0%
9	01/07/2019	100.00%	100.00%	97.0%
10	08/07/2019	100.00%	100.00%	97.0%
11	15/07/2019	100.00%	100.00%	100.0%

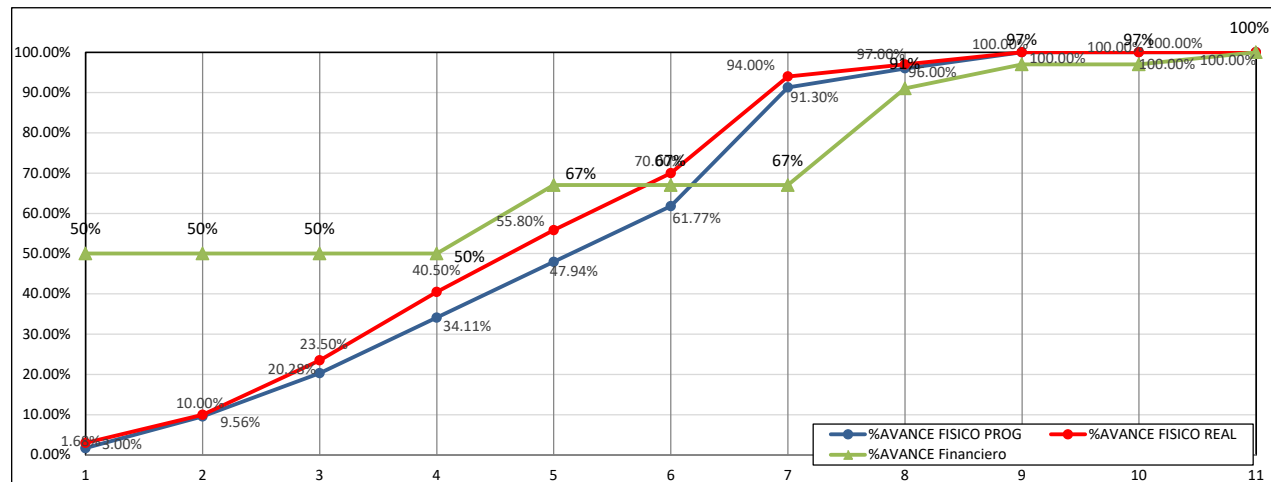

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
