

GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA

DM 007/19 REHABILITACIÓN DE ACCESO Y CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN DIF MUNICIPAL

Obra:

Ubicación: CABECERA MUNICIPAL, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

Contrato: DM 007/19

Tipo de inversión: Fondo Directo Municipal 2019

Contratista: Proyectos Sigma, S.A. de C.V

Programa: DA EDIFICIOS PÚBLICOS

Inicio Vigente: lunes, 9 de septiembre de 2019

Días de Obra: 30 días

Subprograma: 01,03 REHABILITACIÓN, CONSTRUCCIÓN

Inicio Real: lunes, 9 de septiembre de 2019

Monto Contratado: \$ 1,185,949.00


Residente: ARQ. PREDO ANTONIO MEDINA FUENTES

Fin Vigente: martes, 8 de octubre de 2019

Monto Ejercido: \$ 1,185,949.00

Fin Real: martes, 8 de octubre de 2019

SEMANA	FECHA	%AVANCE FISICO PROG	%AVANCE FISICO REAL	%AVANCE Financiero
1	16/09/2019	10.50%	18.00%	50.0%
2	23/09/2019	33.97%	38.00%	50.0%
3	30/09/2019	61.82%	64.00%	80.0%
4	07/10/2019	90.51%	98.00%	80.0%
5	14/10/2019	100.00%	100.00%	80.0%
6	21/10/2019	100.00%	100.00%	80.0%
7	28/10/2019	100.00%	100.00%	80.0%
8	04/11/2019	100.00%	100.00%	100.0%

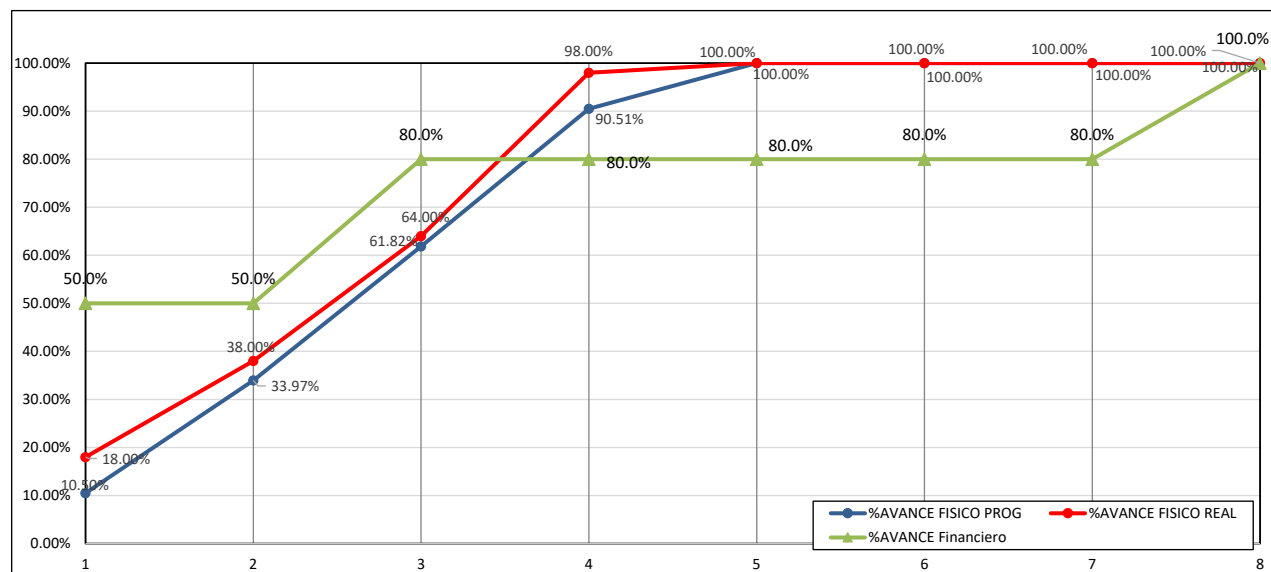

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
