

GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA

Obra: DR 001/19 Pintura en Complejo del Auditorio J. Guadalupe Posada

Ubicación: Cabecera Municipal

Tipo de inversión: Fondo Directo Municipal Remanente 2018

Programa: DA Edificios Públicos

Subprograma: 01 Rehabilitación

Residente: I.C. J. JESÚS HERNANDEZ FUENTES

Contrato: DR 001/19

Contratista: Materiales Triturados del Centro, S.A. de C.V.,

Inicio Vigente: sábado, 14 de septiembre de 2019

Días de Obra: 30 días

Inicio Real: sábado, 14 de septiembre de 2019


Monto Contratado: \$ 745,129.49

Fin Vigente: domingo, 13 de octubre de 2019

Monto Ejercido: \$ 745,129.49

Fin Real: domingo, 13 de octubre de 2019

| SEMANA | FECHA | %AVANCE FISICO PROG | %AVANCE FISICO REAL | %AVANCE Financiero |
|--------|------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 1 | 16/09/2019 | 22.80% | 25.00% | 0% |
| 2 | 23/09/2019 | 45.61% | 50.00% | 0% |
| 3 | 30/09/2019 | 74.93% | 75.00% | 80% |
| 4 | 07/10/2019 | 98.00% | 98.50% | 80% |
| 5 | 14/10/2019 | 100.00% | 100.00% | 80% |
| 6 | 21/10/2019 | 100.00% | 100.00% | 80% |
| 7 | 28/10/2019 | 100.00% | 100.00% | 80% |
| 8 | 04/11/2019 | 100.00% | 100.00% | 80% |
| 9 | 11/11/2019 | 100.00% | 100.00% | 80% |
| 10 | 18/11/2019 | 100.00% | 100.00% | 80% |
| 11 | 25/11/2019 | 100.00% | 100.00% | 80% |
| 12 | 02/12/2019 | 100.00% | 100.00% | 80% |
| 13 | 09/12/2019 | 100.00% | 100.00% | 100% |

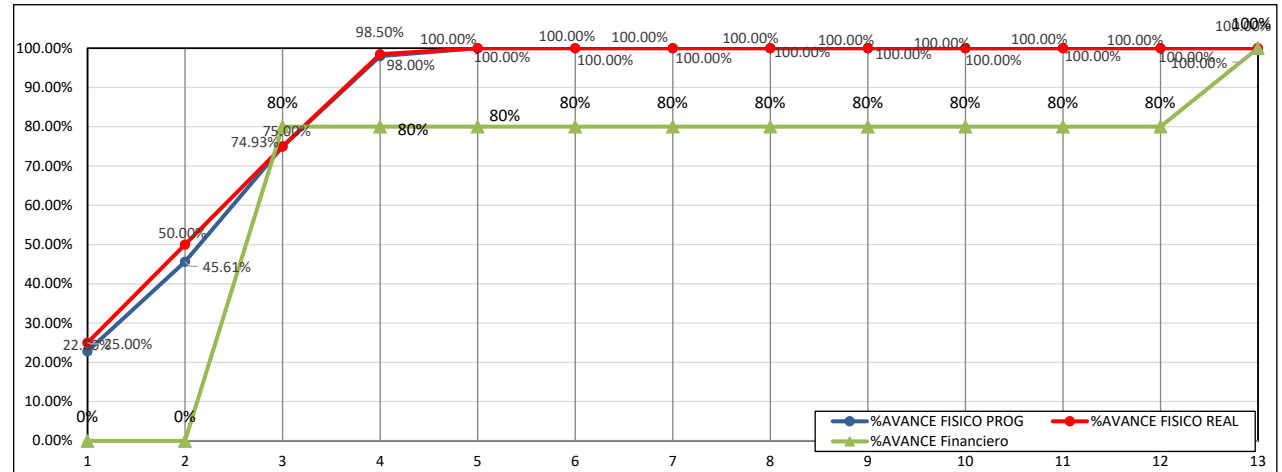

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
