

GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA

Obra: FR 002/19 REHABILITACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA

Ubicación: MACARIO J. GÓMEZ

Tipo de inversión: Programa Fondo Resarcitorio

Programa: SL Infraestructura Educativa

Subprograma: 01 Rehabilitación

Residente: I.C. CARLOS ARMANDO CHÁVEZ GARCÍA

Contrato: FR 002/19

Contratista: GCT Bajío Construcciones, S.A. de C.V.,

Inicio Vigente: lunes, 9 de septiembre de 2019

Días de Obra: 30 días

Inicio Real: lunes, 9 de septiembre de 2019


Monto Contratado: \$ 1,442,598.22

Fin Vigente: martes, 8 de octubre de 2019

Monto Ejercido: \$ 1,442,598.22

Fin Real: martes, 8 de octubre de 2019

SEMANA	FECHA	%AVANCE FISICO PROG	%AVANCE FISICO REAL	%AVANCE Financiero
1	16/09/2019	4.08%	12.00%	50%
2	23/09/2019	26.87%	40.00%	50%
3	30/09/2019	65.40%	58.00%	76%
4	07/10/2019	96.61%	98.00%	76%
5	14/10/2019	100.00%	100.00%	76%
6	21/10/2019	100.00%	100.00%	76%
7	28/10/2019	100.00%	100.00%	76%
8	04/11/2019	100.00%	100.00%	100%

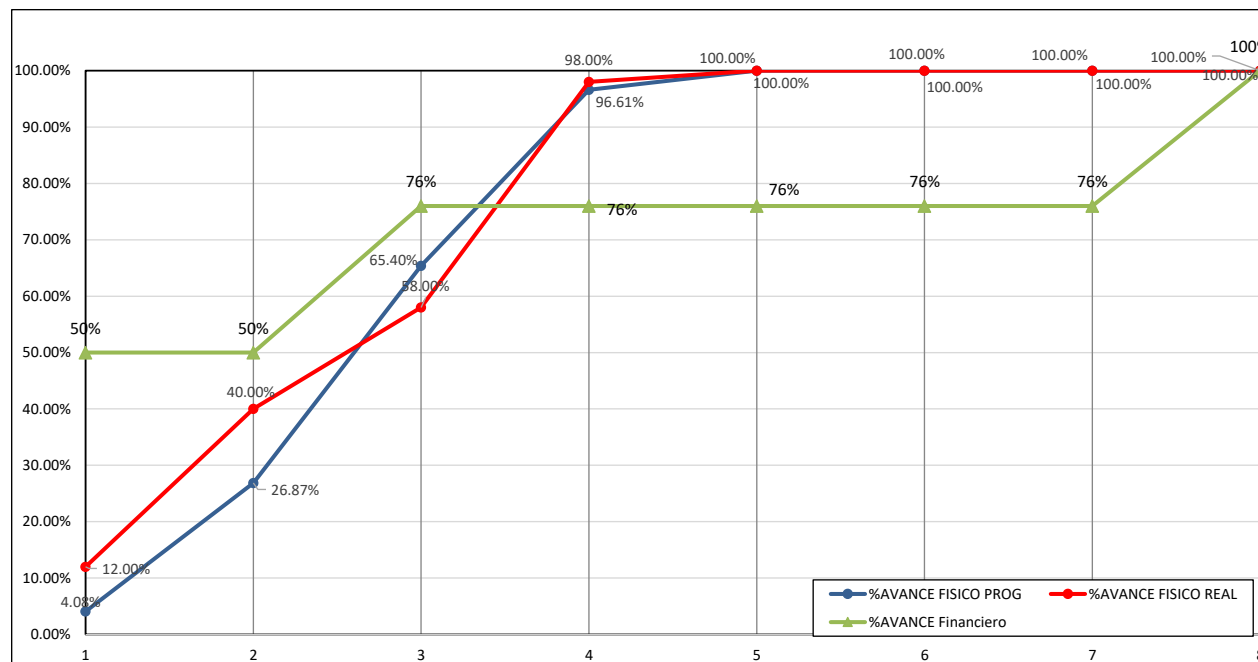

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
