

## GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA

**Obra:** FISMDF 11-003 SERVICIOS SANITARIOS EN CECYTEA No. 3

**Ubicación:** FRACC. HIDALGO, CABECERA MUNICIPAL  
**Tipo de inversión:** Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México


**Contrato:** FISMDF 006/19

**Programa:** SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA  
**Subprograma:** 02, d) CONSTRUCCION - OTROS NIVELES  
**Residente:** I.C. Carlos Armando Chávez García

**Contratista:** I.C. Tereso Javier de la Peña Castillo  
**Inicio Vigente:** Lunes, 3 de junio de 2019  
**Inicio Real:** lunes, 3 de junio de 2019  
**Fin Vigente:** sábado, 10 de agosto de 2019  
**Fin Real:** sábado, 10 de agosto de 2019

**Días de Obra:** 69 días  
**Monto Contratado:** \$1,343,951.42  
**Monto Ejercido:** \$1,343,951.42

SEMANA	FECHA	%AVANCE FISICO PROG	%AVANCE FISICO REAL	%AVANCE Financiero
1	10/06/2019	2.26%	3.50%	50%
2	17/06/2019	9.87%	10.12%	50%
3	24/06/2019	27.80%	31.80%	57%
4	01/07/2019	48.49%	50.20%	57%
5	08/07/2019	64.29%	65.00%	57%
6	15/07/2019	78.38%	80.00%	64%
7	22/07/2019	91.53%	95.00%	64%
8	29/07/2019	99.95%	99.98%	70%
9	05/08/2019	100.00%	100.00%	76%
10	12/08/2019	100.00%	100.00%	76%
11	19/08/2019	100.00%	100.00%	76%
12	26/08/2019	100.00%	100.00%	94%
13	02/09/2019	100.00%	100.00%	94%
14	09/09/2019	100.00%	100.00%	94%
15	16/09/2019	100.00%	100.00%	94%
16	23/09/2019	100.00%	100.00%	100%

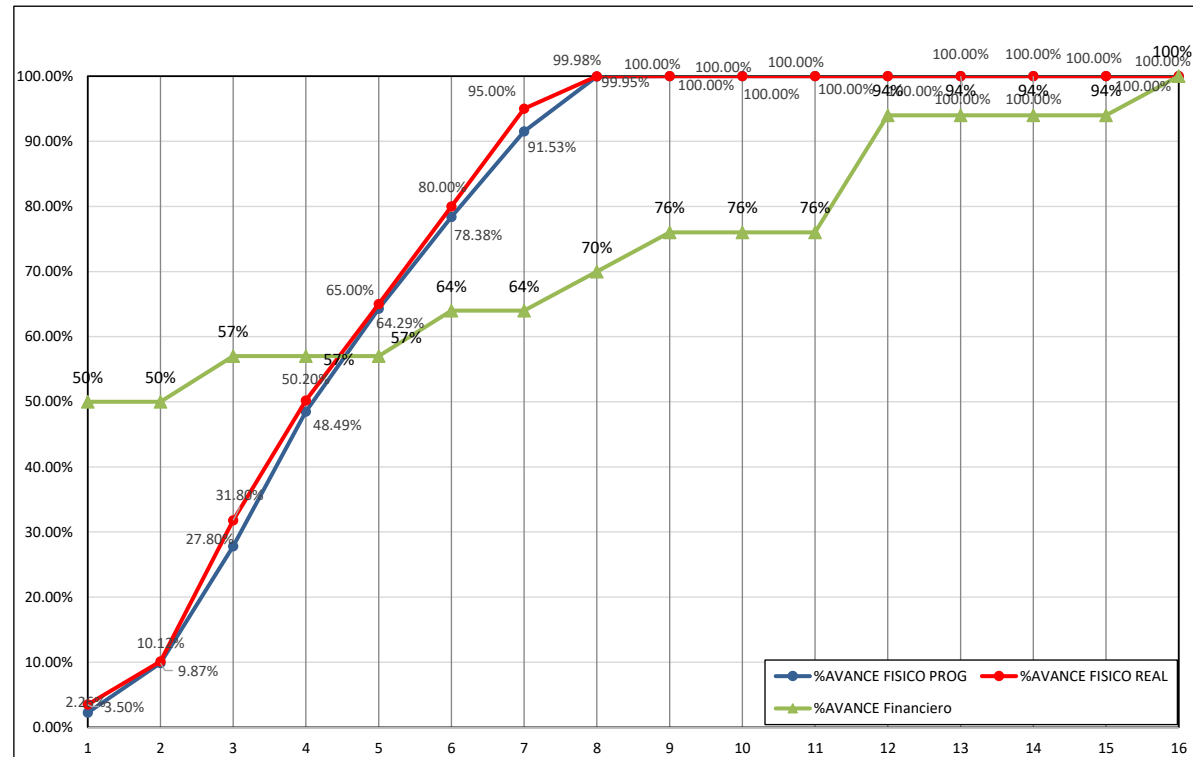

**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO**
