

## GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA

**Obra:** FISDMF 11-004 CONSTRUCCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS.-ZONA NORTE DEL MUNICIPIO

**Ubicación:** (AMAPOLAS DEL RIO, ANTORCHA CAMPESINA, BORROTES, FRACC.CERRADA SAN FRANCISCO, FRACC. EL BARRANCO, FRACC.HIDALGO, FRACC.LOS LIRIOS, FRACC.REVOLUCION, LA PROVIDENCIA, OJO DE AGUA DEL MEZQUITE, FRACC. SAN JOSE DEL BARRANCO, FRACC. SANTA BARBARA, TEPETATE, ZONA CENTRO.)

**Tipo de inversión:** Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México

**Programa:** SH Vivienda Digna

**Subprograma:** 02 b) Ampliación de Vivienda

**Residente:** T.C. FERNANDO LUNA MEDINA

**Contrato:** FISDMF 008/19

**Contratista:** BUFETE DE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL CENTRO, S.A. DE C.V.

**Inicio Vigente:** martes, 13 de agosto de 2019

**Inicio Real:** martes, 13 de agosto de 2019

**Fin Vigente:** lunes, 25 de noviembre de 2019


**Fin Real:** lunes, 25 de noviembre de 2019

**Días de Obra:** 105 días

**Monto Contratado:** \$ 3,259,882.52

**Monto Ejercido:** \$ 3,259,882.52

SEMANA	FECHA	%AVANCE FISICO PROG	%AVANCE FISICO REAL	%AVANCE Financiero
1	19/08/2019	2.80%	4.50%	50%
2	26/08/2019	4.60%	10.00%	50%
3	02/09/2019	9.20%	18.00%	50%
4	09/09/2019	13.80%	25.00%	50%
5	16/09/2019	18.40%	32.00%	50%
6	23/09/2019	27.91%	41.00%	75%
7	30/09/2019	36.82%	54.00%	88%
8	07/10/2019	45.33%	61.00%	88%
9	14/10/2019	56.44%	68.00%	88%
10	21/10/2019	66.01%	73.00%	88%
11	28/10/2019	75.58%	78.00%	88%
12	04/11/2019	85.15%	90.00%	88%
13	11/11/2019	94.72%	95.00%	88%
14	18/11/2019	97.36%	98.00%	88%
15	25/11/2019	100.00%	100.00%	88%
16	02/12/2019	100.00%	100.00%	100%

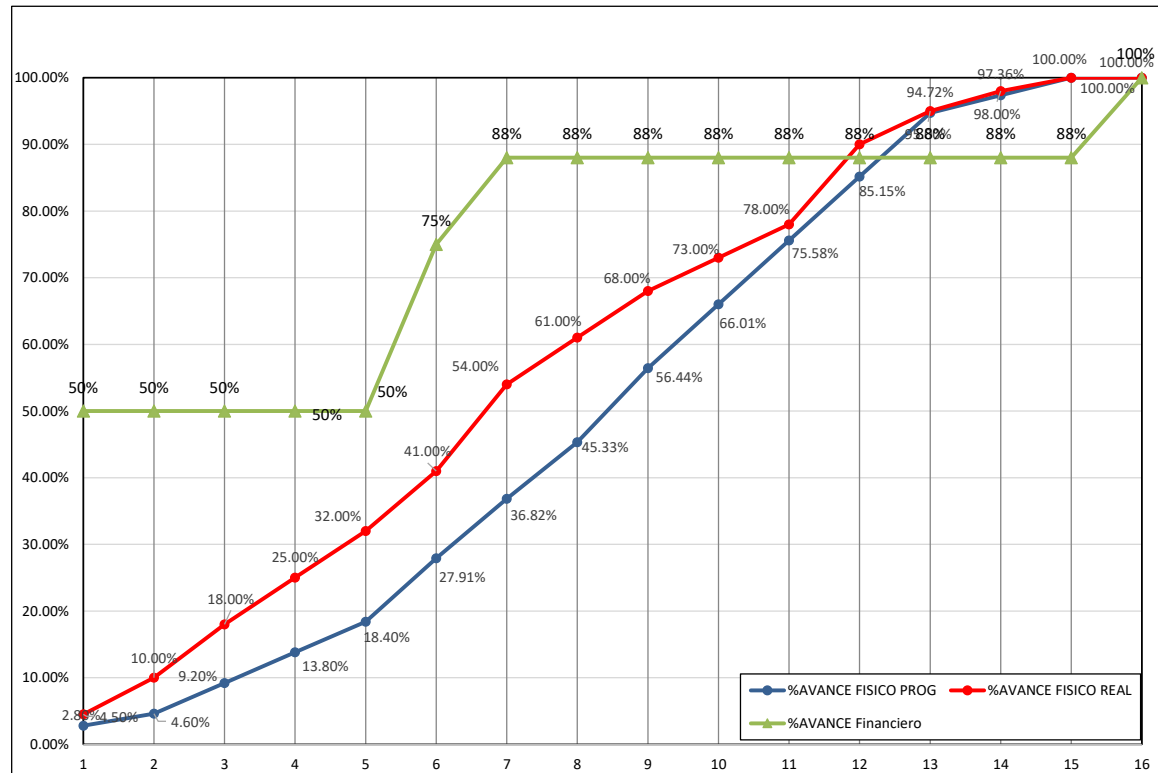

**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO**
