

## GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA

**FISMDF 11-007 Rehabilitación de Canchas y Espacios Multideportivos**

**Obra:**

La Concepción y Amapolas del Río

**Ubicación:**

**Tipo de inversión:** Fondo para la Infraestructura Social Municipal y las Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México (FISMDF)

**Programa:** SL Infraestructura Deportiva

**Subprograma:** 01 Rehabilitación

**Residente:** ING. MIGUEL ANGEL SILVA SERNA

**Contrato:** FISMDF 011/19

**Contratista:** MAOFRE, GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V

**Inicio Vigente:** viernes, 20 de diciembre de 2019

**Inicio Real:** viernes, 20 de diciembre de 2019

**Fin Vigente:** domingo, 29 de diciembre de 2019


**Fin Real:** domingo, 29 de diciembre de 2019

**Días de Obra:** 10 días

**Monto Contratado:** \$ 999,136.00

**Monto Ejercido:** \$ 999,136.00

SEMANA	FECHA	%AVANCE FISICO PROG	%AVANCE FISICO REAL	%AVANCE Financiero
1	23/12/2019	60.00%	65.00%	50%
2	30/12/2019	100.00%	100.00%	100%

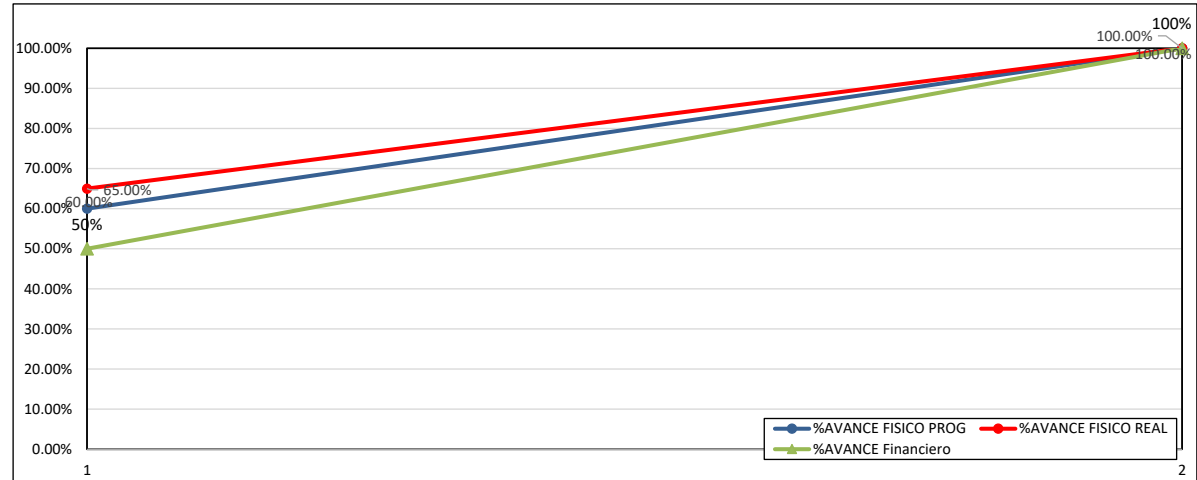

**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO**
