

GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA


Obra: COM 001/19 Relleno de Socavón

Ubicación: El Panzazo
Tipo de inversión: Convenio Organismo Operador del Agua y Municipio de San Francisco de los Romo
Programa: SD Alcatarillado
Subprograma: 01 Rehabilitación
Residente: T.C. FERNANDO LUNA MEDINA

Contrato: COM 002/19
Contratista: Teresa Urbanizadora, S.A. de C.V.,
Inicio Vigente: jueves, 3 de octubre de 2019
Inicio Real: jueves, 3 de octubre de 2019
Fin Vigente: jueves, 17 de octubre de 2019
Fin Real: jueves, 17 de octubre de 2019

Días de Obra: 15 días
Monto Contratado: \$ 444,408.47
Monto Ejercido: \$ 444,408.47

SEMANA	FECHA	%AVANCE FISICO PROG	%AVANCE FISICO REAL	%AVANCE Financiero
1	07/10/2019	11.45%	15.00%	50%
2	14/10/2019	64.63%	70.00%	50%
3	21/10/2019	98.00%	99.80%	50%
4	28/10/2019	100.00%	100.00%	100%

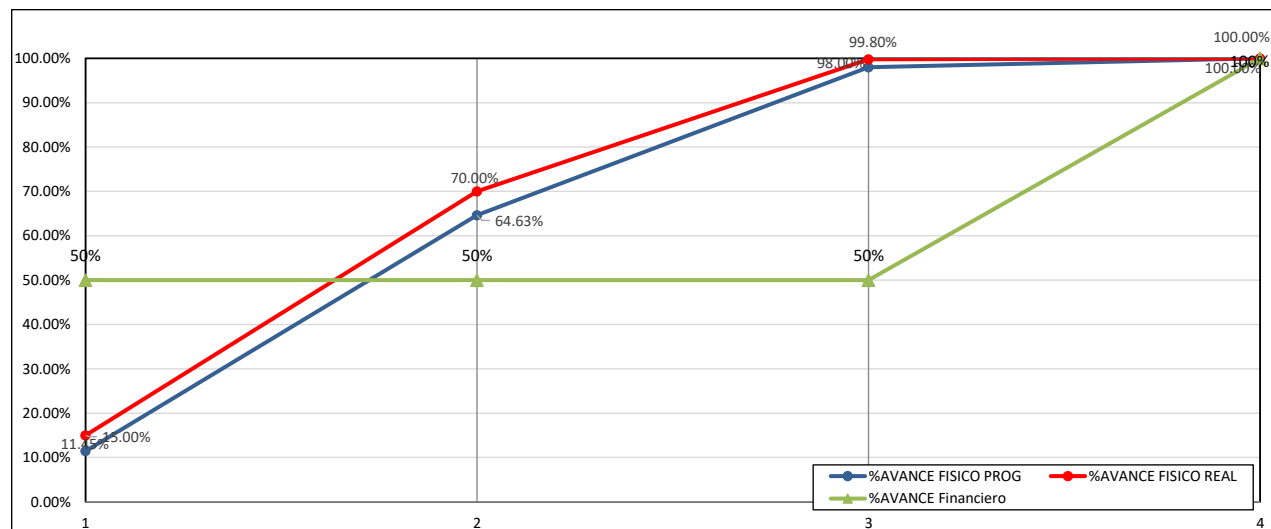

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
