

## GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA

Obra: IP 006/19 PINTURA EN VIALIDADES AV. JUÁREZ DE LIBRAMIENTO A LUIS MOYA A CALLE ARGENTINA Y CAMINO A LA COL. FRATERNIDAD

Ubicación: CABECERA MUNICIPAL  
 Tipo de inversión: PROGRAMA INGRESOS PROPIOS

Contrato: IP 001/19  
 Contratista: C. Ing. Roberto Silva Arjón

Programa: SE URBANIZACION

Inicio Vigente: miércoles, 25 de septiembre de 2019

Días de Obra: 5 días

Subprograma:

Inicio Real: miércoles, 25 de septiembre de 2019

Monto Contratado: \$ 472,080.93


Residente: NG. MIGUEL ANGEL SILVA SERNA

Fin Vigente: domingo, 29 de septiembre de 2019

Monto Ejercido: \$ 472,080.93

Fin Real: domingo, 29 de septiembre de 2019

SEMANA	FECHA	%AVANCE FISICO PROG	%AVANCE FISICO REAL	%AVANCE Financiero
1	25/09/2019	15.36%	17.00%	0%
2	26/09/2019	37.56%	40.00%	0%
3	27/09/2019	57.71%	61.00%	0%
4	28/09/2019	99.80%	99.80%	0%
5	29/09/2019	100.00%	100.00%	0%
6	30/09/2019	100.00%	100.00%	0%
7	01/10/2019	100.00%	100.00%	0%
8	02/10/2019	100.00%	100.00%	100%

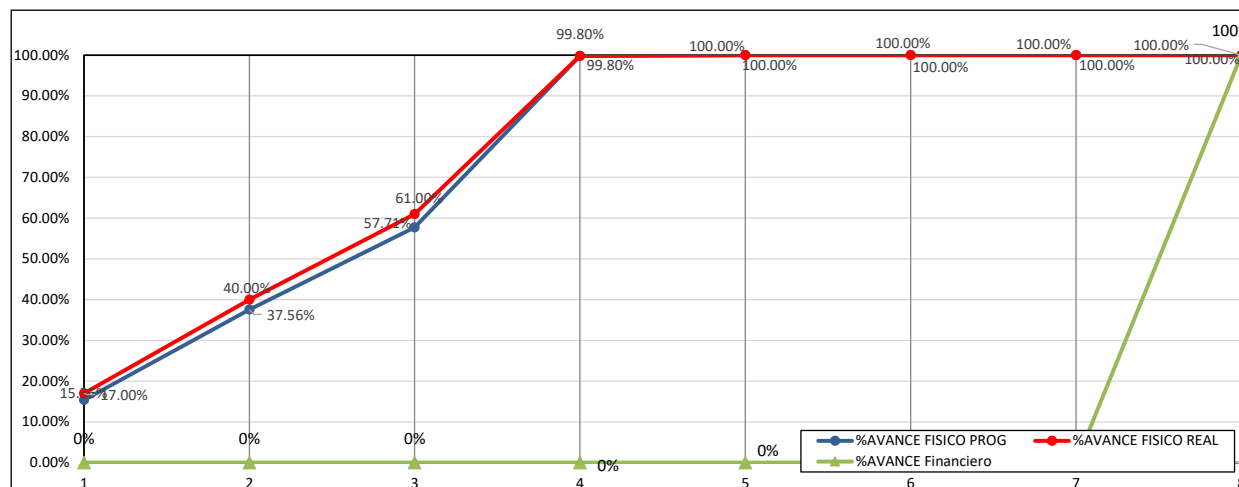

**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO**
