

## GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA

**PFR 003/20 REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE VARIAS CALLES**


**Obra:**

**Ubicación:** CABECERA MUNICIPAL  
**Tipo de inversión:** PARTICIPACIONES FEDERALES REMANENTE 2019  
**Programa:** SD/ SC ALCANTARILLADO / AGUA POTABLE  
**Subprograma:** 01 REHABILITACION  
**Residente:** T.C. FERNANDO LUNA MEDINA

**Contrato:** PFR002/2020  
**Contratista:** CONSTRUCTORA FLORES HERMANOS, S.A. DE C.V.  
**Inicio Vigente:** lunes, 22 de junio de 2020  
**Inicio Real:** lunes, 22 de junio de 2020  
**Fin Vigente:** jueves, 20 de agosto de 2020  
**Fin Real:**

**Días de Obra:** 60 días  
**Monto Contratado:** \$ 1,079,099.93  
**Monto Ejercido:**

SEMANA	FECHA	%AVANCE FISICO PROG	%AVANCE FISICO REAL	%AVANCE Financiero
1	29/06/2020	5.29%	7.50%	50.0%
2	06/07/2020	11.93%		
3	13/07/2020	22.50%		
4	20/07/2020	37.79%		
5	27/07/2020	49.94%		
6	03/08/2020	57.16%		
7	10/08/2020	73.93%		
8	17/08/2020	87.58%		
9	24/08/2020	100.00%		

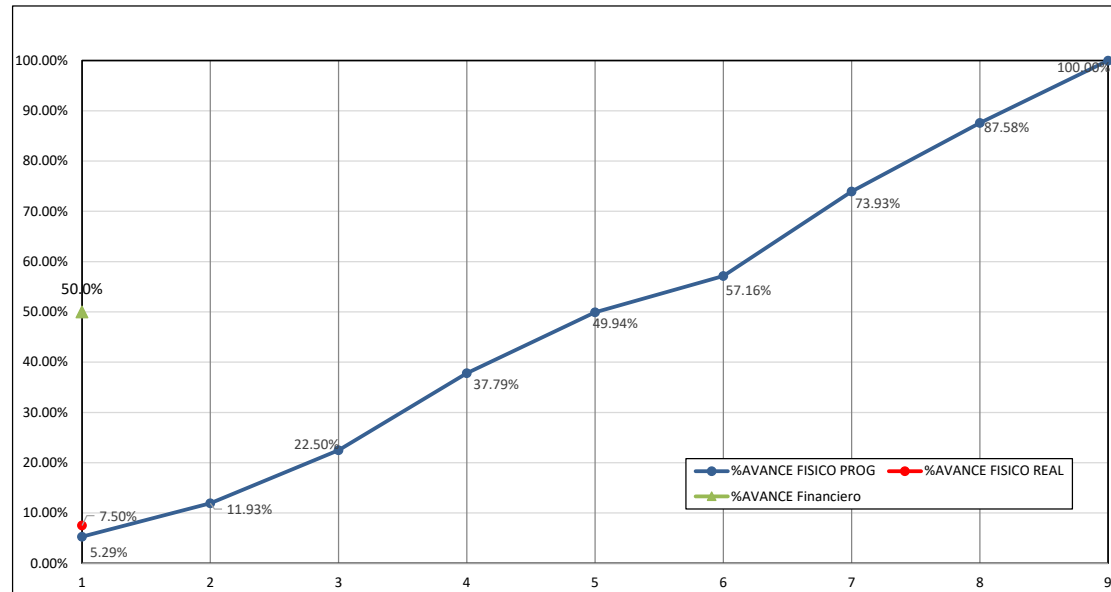

**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO**
