

## GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA

**Obra:** FRR 002/20 REHABILITACIÓN DE ARROYO VEHICULAR, AV. JUAREZ, TRAMO CALLE ARGENTINA A FCO. I. MADERO

**Ubicación:** CABECERA MUNICIPAL, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO  
**Tipo de inversión:** FONDO RESARCITORIO REMANENTE 2019

**Programa:** SF PAVIMENTACION EN ZONAS POPULARES

**Subprograma:** 01 CONCRETO

**Residente:** I.C. J. JESÚS HERNANDEZ FUENTES

**Contrato:** FRR 002/2020

**Contratista:** INMOBILIARIA TENEXAC, S.A. DE C.V.

**Inicio Vigente:** lunes, 13 de abril de 2020

**Inicio Real:** lunes, 13 de abril de 2020

**Fin Vigente:** domingo, 3 de mayo de 2020


**Fin Real:** domingo, 3 de mayo de 2020

**Días de Obra:** 21 días

**Monto Contratado:** \$ 289,170.87

**Monto Ejercido:** \$ 287,549.93

SEMANA	FECHA	%AVANCE FISICO PROG	%AVANCE FISICO REAL	%AVANCE FINANCIERO
1	19/04/2020	9.60%	12.00%	0.0%
2	26/04/2020	54.80%	58.00%	0.0%
3	03/05/2020	100.00%	100.00%	0.0%
4	10/05/2020	100.00%	100.00%	99.4%

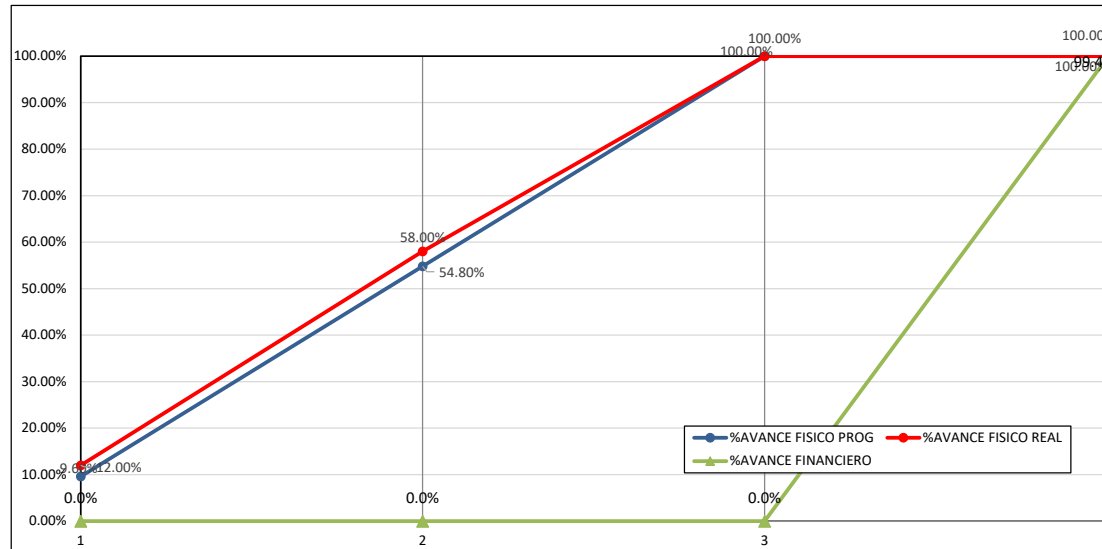

**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO**
