

## GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA

**FRR 003/20 SEÑALIZACIÓN VIAL, REFORESTACIÓN Y REHABILITACIÓN DE EQUIPAMIENTO, AV. JUAREZ**


**Obra:**

**Ubicación:** CABECERA MUNICIPAL  
**Tipo de inversión:** FONDO RESARCITORIO REMANENTE 2019  
**Programa:** SE URBANIZACIÓN  
**Subprograma:** REHABILITACIÓN  
**Residente:** I.C. J. JESÚS HERNANDEZ FUENTES

**Contrato:** FRR 003/2020  
**Contratista:** CONSTRUCTORA FLORES HERMANOS, S.A. DE C.V.  
**Inicio Vigente:** viernes, 12 de junio de 2020  
**Inicio Real:** viernes, 12 de junio de 2020  
**Fin Vigente:** jueves, 2 de julio de 2020  
**Fin Real:** jueves, 2 de julio de 2020

**Días de Obra:** 21 días  
**Monto Contratado:** \$ **435,870.32**  
**Monto Ejercido:**

SEMANA	FECHA	%AVANCE FISICO PROG	%AVANCE FISICO REAL	%AVANCE Financiero
1	15/06/2020	12.40%	20.00%	50.0%
2	22/06/2020	43.35%	53.00%	50.0%
3	29/06/2020	77.05%	85.00%	50.0%
4	06/07/2020	100.00%	100.00%	50.0%

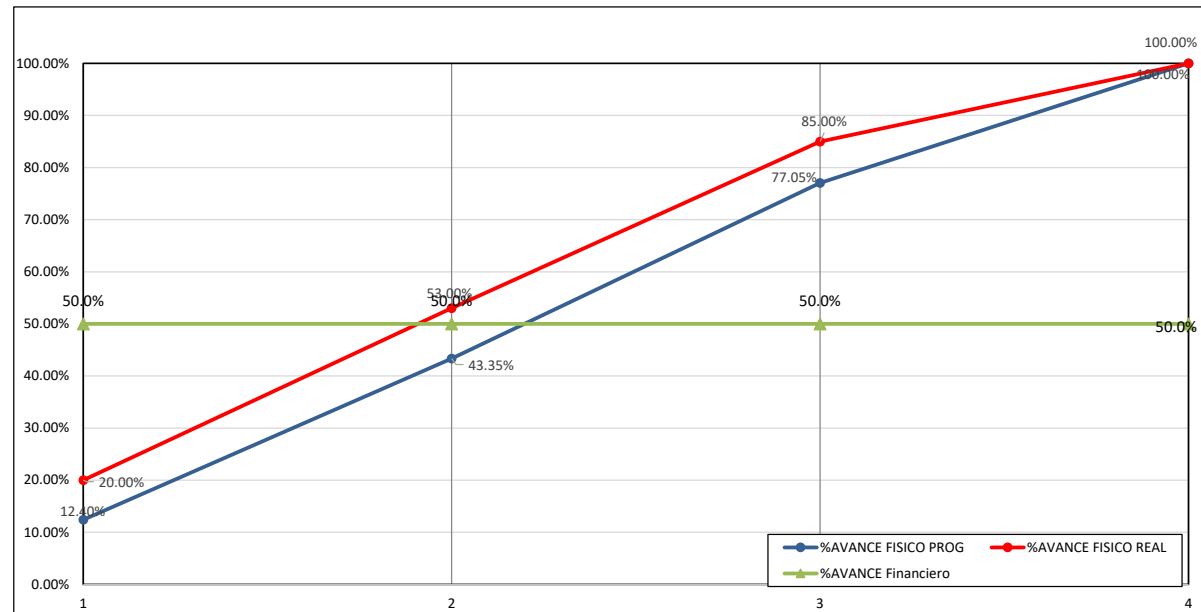

**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO**
