


GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA

Obra: PFR 001/20 CONSTRUCCIÓN DE PÓRTICO Y REJA PERIMETRAL EN E.P. NICOLAS BRAVO
Ubicación: PARTICIPACIONES FEDERALES REMANENTE 2019 **Contrato:** PFR 001/2020
Tipo de inversión: **Contratista:** CORACO, S.A. DE C.V.
Programa: SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA **Inicio Vigente:** miércoles, 17 de junio de 2020 **Días de Obra:** 30 días
Subprograma: 02 b) CONSTRUCCIÓN - PRIMARIA **Inicio Real:** miércoles, 17 de junio de 2020 **Monto Contratado:** \$494,999.03
Residente: ARQ. PEDRO ANONIO MEDINA FUENTES **Fin Vigente:** sábado, 15 de agosto de 2020 **Monto Ejercido:**
Fin Real:

SEMANA	FECHA	%AVANCE FISICO PROG	%AVANCE FISICO REAL	%AVANCE Financiero
1	22/06/2020	5.07%	7.50%	50.0%
2	29/06/2020	23.67%	27.00%	
3	06/07/2020	68.65%		
4	13/07/2020	92.66%		
5	20/07/2020	100.00%		

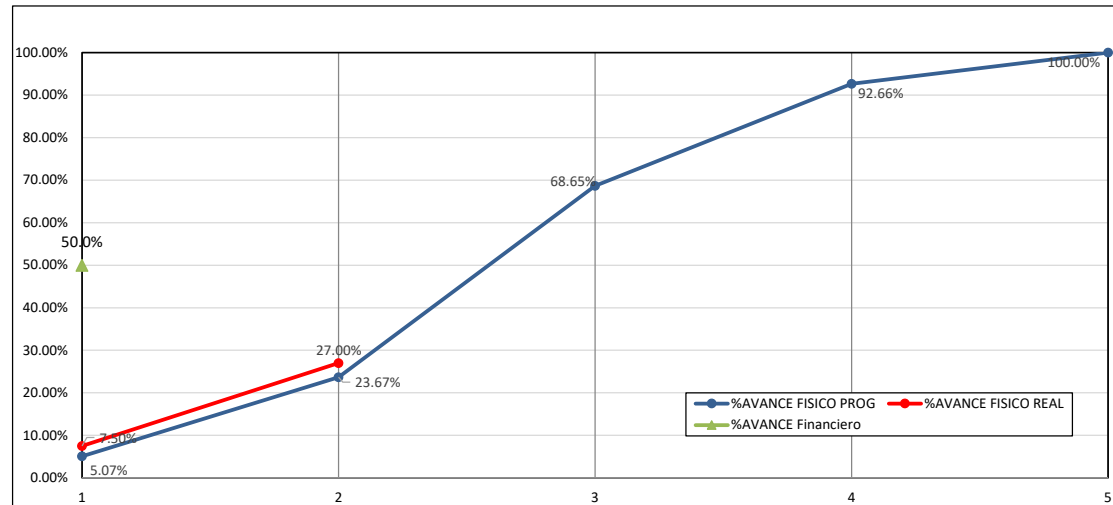

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
