

GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA

PFR 003/20 REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE VARIAS CALLES


Obra:

Ubicación: CABECERA MUNICIPAL
Tipo de inversión: PARTICIPACIONES FEDERALES REMANENTE 2019
Programa: SD/ SC ALCANTARILLADO / AGUA POTABLE
Subprograma: 01 REHABILITACION
Residente: T.C. FERNANDO LUNA MEDINA

Contrato: PFR002/2020
Contratista: CONSTRUCTORA FLORES HERMANOS, S.A. DE C.V.
Inicio Vigente: lunes, 22 de junio de 2020
Inicio Real: sábado, 20 de junio de 2020
Fin Vigente: martes, 18 de agosto de 2020
Fin Real: martes, 18 de agosto de 2020

Días de Obra: 60 días
Monto Contratado: \$ 1,079,099.93
Monto Ejercido:

SEMANA	FECHA	%AVANCE FISICO PROG	%AVANCE FISICO REAL	%AVANCE Financiero
1	29/06/2020	5.29%	7.50%	50.0%
2	06/07/2020	11.93%	14.00%	62.0%
3	13/07/2020	22.50%	25.00%	62.0%
4	20/07/2020	37.79%	39.00%	62.0%
5	27/07/2020	49.94%	52.00%	62.0%
6	03/08/2020	57.16%	60.00%	89.0%
7	10/08/2020	73.93%	75.00%	
8	17/08/2020	87.58%	88.00%	
9	24/08/2020	100.00%	100.00%	
10	31/08/2020	100.00%	100.00%	
11	07/09/2020	100.00%	100.00%	
12	14/09/2020	100.00%	100.00%	
13	21/09/2020	100.00%	100.00%	

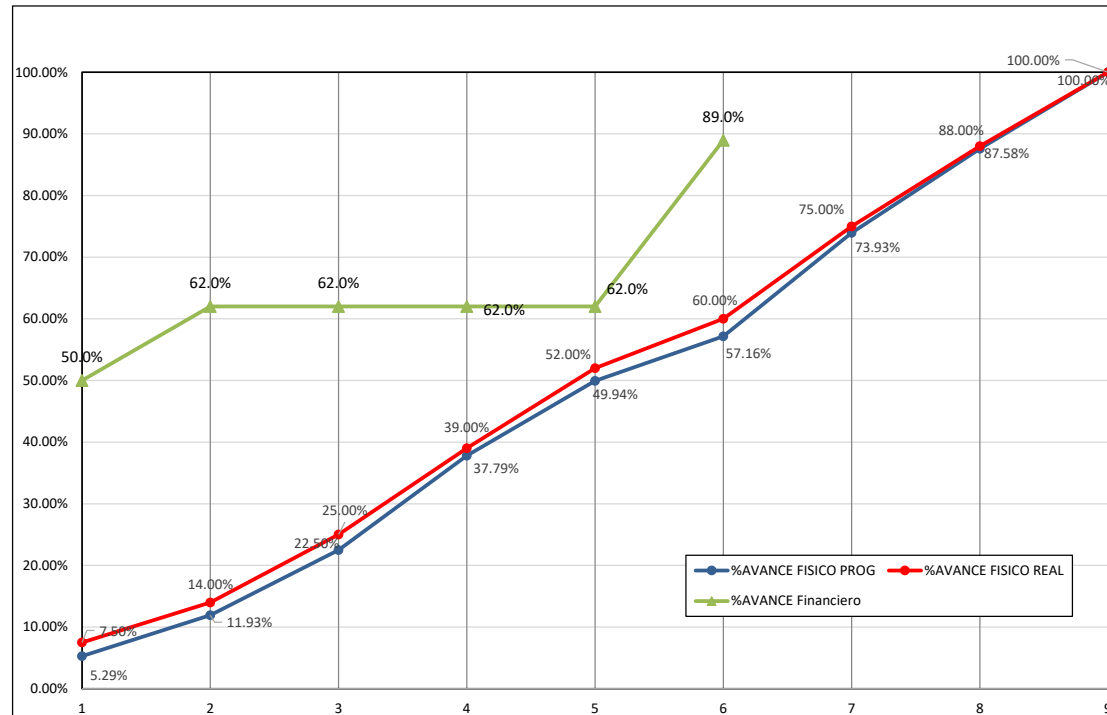

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
