

## GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA

**PFR 004/20 REHABILITACIÓN DE PARQUES DE BEISBOL**

**Obra:**

**Ubicación:** VARIAS COMUNIDADES MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO **Contrato:** PFR 005/2020

**Tipo de inversión:** PARTICIPACIONES FEDERALES REMANENTE 2019 **Contratista:** Conestructura, S.A. de C.V.

**Programa:** SL INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA **Inicio Vigente:** lunes, 28 de septiembre de 2020 **Días de Obra:** 60 DIAS


01 REHABILITACIÓN

**Subprograma:** **Inicio Real:** lunes, 28 de septiembre de 2020 **Monto Contratado:** \$ 1,053,255.48

**Residente:** I.C. CARLOS ARMANDO CHAVEZ GARCÍA **Fin Vigente:** jueves, 26 de noviembre de 2020 **Monto Ejercido:**

**Fin Real:**

SEMANA	FECHA	%AVANCE FISICO PROG	%AVANCE FISICO REAL	%AVANCE Financiero
1	05/10/2020	4.35%	5.20%	50.0%
2	12/10/2020	9.65%		
3	19/10/2020	26.07%		
4	26/10/2020	41.88%		
5	02/11/2020	62.35%		
6	09/11/2020	71.70%		
7	16/11/2020	84.96%		
8	23/11/2020	92.84%		
9	30/11/2020	100.00%		

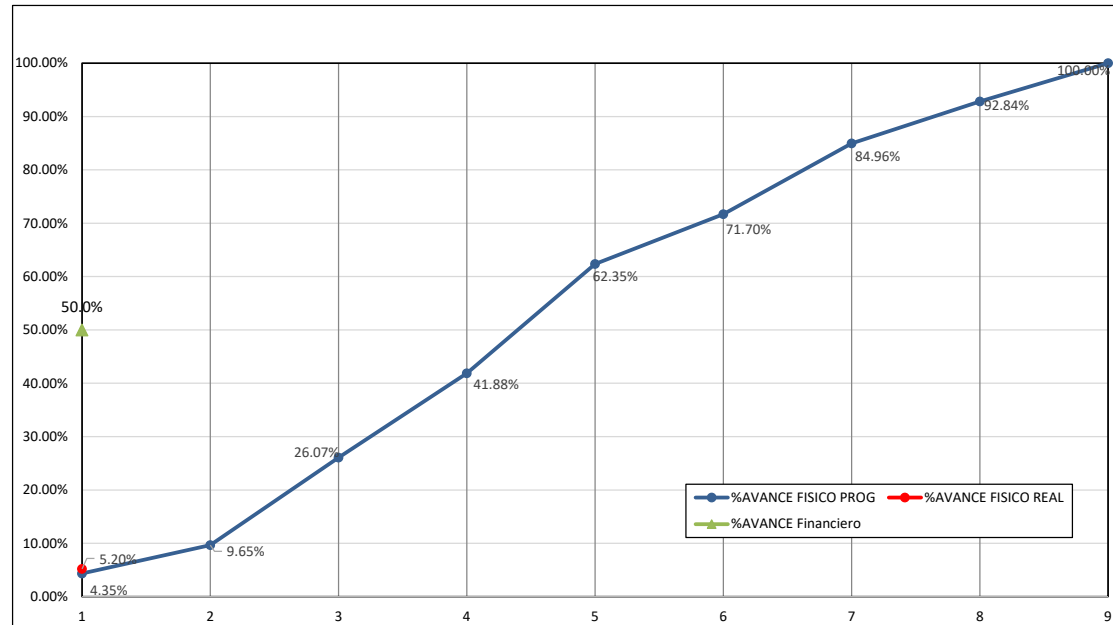

**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO**
