


GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA

Obra: DM 001/20 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, DE INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS
Ubicación: TODO EL MUNICIPIO **Contrato:** DM 001/2020
Tipo de inversión: DIRECTO MUNICIPAL 2020 **Contratista:** Ing. Ángel de Jesús Ramírez Guardado
Programa: U9 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO REGIONAL **Inicio Vigente:** viernes, 12 de junio de 2020 **Días de Obra:** 190 días
Subprograma: 01, 03 ESTUDIOS Y PROYECTOS, SERVICIOS **Inicio Real:** lunes, 22 de junio de 2020 **Monto Contratado:** \$ 249,956.80
Residentes: ARQ. PEDRO ANTONIO MEDINA FUENTES **Fin Vigente:** viernes, 18 de diciembre de 2020 **Monto Ejercido:**
Fin Real:

SEMANA	FECHA	%AVANCE FISICO PROG	%AVANCE FISICO REAL	%AVANCE Financiero
1	15/06/2020	29.89%	30.00%	0.0%
2	22/06/2020	33.41%	34.00%	0.0%
3	29/06/2020	34.78%	35.00%	0.0%
4	06/07/2020	37.52%	38.00%	0.0%
5	13/07/2020	38.89%	40.00%	0.0%
6	20/07/2020	40.26%	42.00%	0.0%
7	27/07/2020	43.00%	45.00%	0.0%
8	03/08/2020	45.74%	47.00%	0.0%
9	10/08/2020	48.47%	49.00%	0.0%
10	17/08/2020	49.94%	50.00%	0.0%
11	24/08/2020	52.58%	55.00%	0.0%
12	31/08/2020	55.32%	56.00%	0.0%
13	07/09/2020	58.06%	59.00%	0.0%
14	14/09/2020	59.43%	60.00%	0.0%
16	21/09/2020	62.16%	63.00%	0.0%
16	28/09/2020	64.90%	65.00%	0.0%
17	05/10/2020	67.64%		
18	12/10/2020	69.01%		
19	19/10/2020	71.75%		
20	26/10/2020	74.48%		
21	02/11/2020	75.85%		
22	09/11/2020	79.96%		
23	16/11/2020	82.70%		
24	23/11/2020	84.07%		
25	30/11/2020	85.44%		
26	07/12/2020	85.44%		
27	14/12/2020	95.00%		
28	21/12/2020	100.00%		

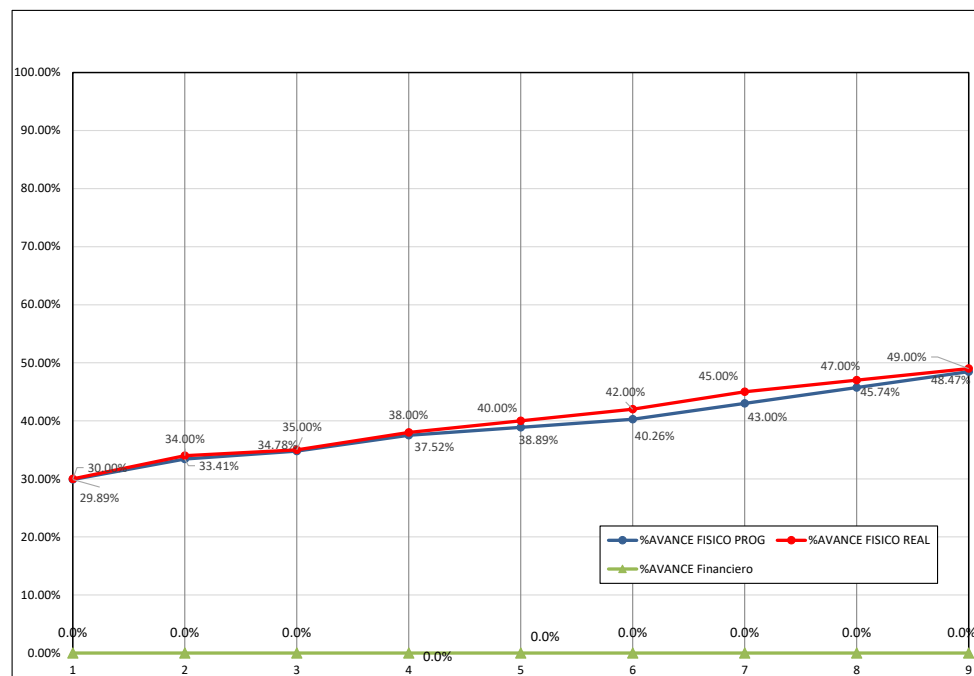

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
