

GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA

FRR 003/20 SEÑALIZACIÓN VIAL, REFORESTACIÓN Y REHABILITACIÓN DE EQUIPAMIENTO, AV. JUAREZ


Obra:

Ubicación: CABECERA MUNICIPAL
Tipo de inversión: FONDO RESARCITORIO REMANENTE 2019
Programa: SE URBANIZACIÓN
Subprograma: REHABILITACIÓN
Residente: I.C. J. JESÚS HERNANDEZ FUENTES

Contrato: FRR 003/2020
Contratista: CONSTRUCTORA FLORES HERMANOS, S.A. DE C.V.
Inicio Vigente: viernes, 12 de junio de 2020
Inicio Real: viernes, 12 de junio de 2020
Fin Vigente: jueves, 2 de julio de 2020
Fin Real: jueves, 2 de julio de 2020

Días de Obra: 21 días
Monto Contratado: \$ **435,870.32**
Monto Ejercido: \$ **435,870.32**

SEMANA	FECHA	%AVANCE FISICO PROG	%AVANCE FISICO REAL	%AVANCE Financiero
1	15/06/2020	12.40%	20.00%	50.0%
2	22/06/2020	43.35%	53.00%	50.0%
3	29/06/2020	77.05%	85.00%	50.0%
4	06/07/2020	100.00%	100.00%	50.0%
5	13/07/2020	100.00%	100.00%	94.0%
6	20/07/2020	100.00%	100.00%	94.0%
7	27/07/2020	100.00%	100.00%	94.0%
8	03/08/2020	100.00%	100.00%	100.0%

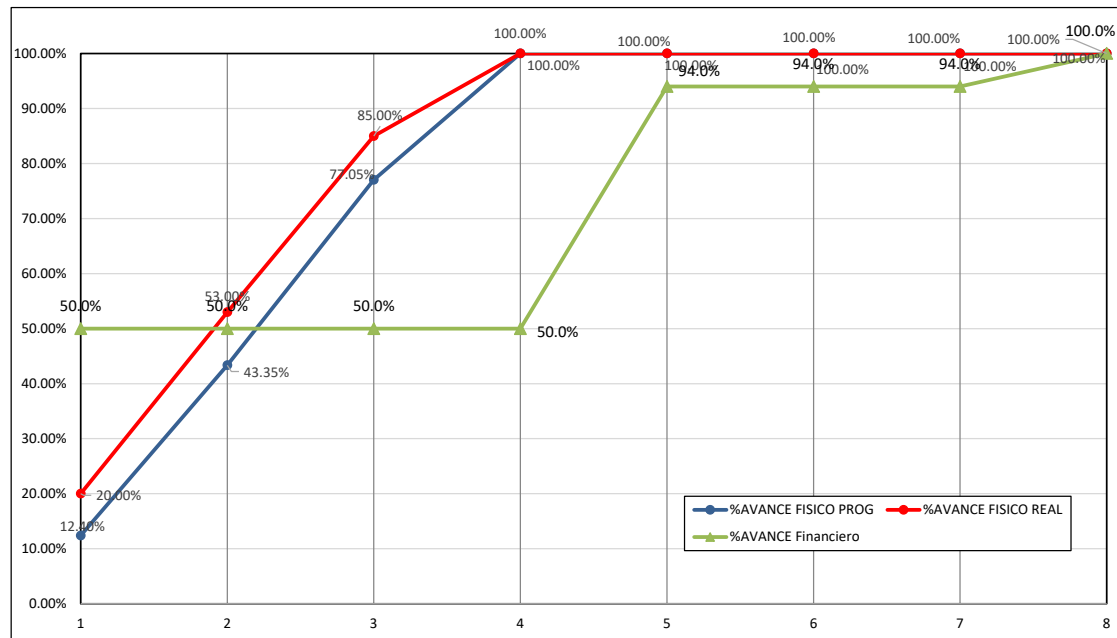

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
