


GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA

Obra: PFR 001/20 CONSTRUCCIÓN DE PÓRTICO Y REJA PERIMETRAL EN E.P. NICOLAS BRAVO	Contrato: PFR 001/2020	
Ubicación: ESCONDIDA	Contratista: CORACO, S.A. DE C.V	
Tipo de inversión: PARTICIPACIONES FEDERALES REMANENTE 2019	Inicio Vigente: miércoles, 17 de junio de 2020	Días de Obra: 30 días
Programa: SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	Inicio Real: miércoles, 17 de junio de 2020	Monto Contratado: \$ 510,000.00
Subprograma: 02 b) CONSTRUCCIÓN - PRIMARIA	Fin Vigente: jueves, 16 de julio de 2020	Monto Ejercido: \$ 510,000.00
Residente: ARQ. PEDRO ANONIO MEDINA FUENTES	Fin Real: jueves, 16 de julio de 2020	

SEMANA	FECHA	%AVANCE FISICO PROG	%AVANCE FISICO REAL	%AVANCE Financiero
1	22/06/2020	5.07%	7.50%	50.0%
2	29/06/2020	23.67%	27.00%	50.0%
3	06/07/2020	68.65%	71.00%	50.0%
4	13/07/2020	92.66%	97.00%	50.0%
5	20/07/2020	100.00%	100.00%	50.0%
6	27/07/2020	100.00%	100.00%	50.0%
7	03/08/2020	100.00%	100.00%	100.0%

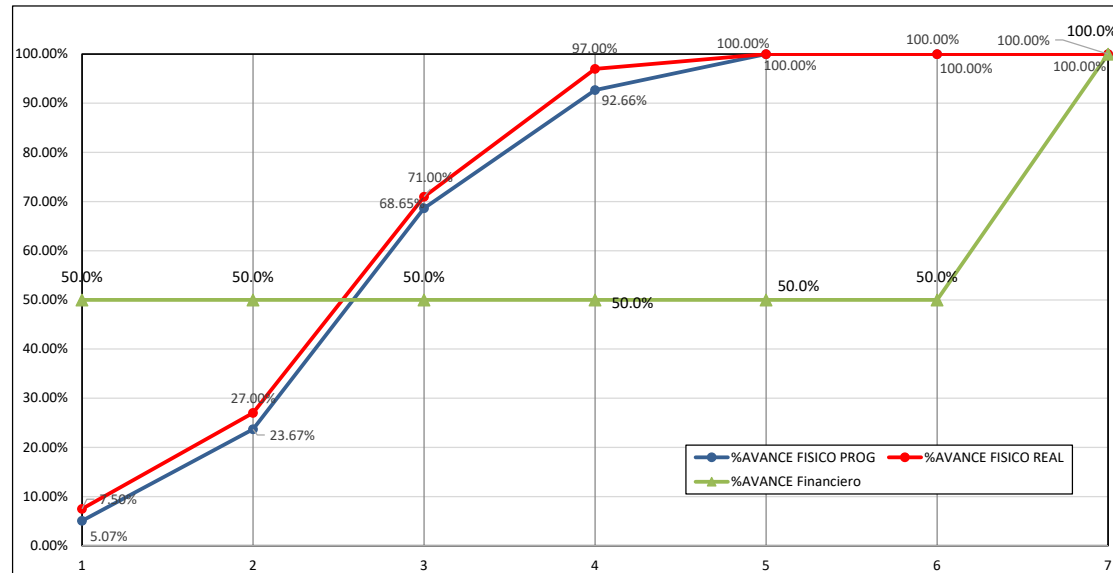

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
