

GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA

Obra: FISMDF 11-021, REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO, CALLE 2 DE ABRIL (TRAMO CALLE INDEPENDENCIA PTE HASTA CALLE VICENTE GUERRERO)
 FISMDF 11-016 REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE, CALLE FCO. I. MADERO (TRAMO ENTRE LAS CALLES ROMO DE VIVAR HASTA LA CALLE JOSE MARIA MORELOS)
 FISMDF 11-022 REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO, CALLE NOGALES (TRAMO ALAMO HASTA PALMAS)

Ubicación: FRACC. REVOLUCION; FRACC. LOS CEDROS, CABECERA MUNICIPAL
Tipo de inversión: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2020

Contrato:
Contratista: CORACO, S.A. DE C.V.

Programa: SD ALCANTARILLADO, SC AGUA POTABLE

Inicio Vigente: martes, 20 de octubre de 2020

Días de Obra: 45

Subprograma: 01 REHABILITACION

Inicio Real: martes, 20 de octubre de 2020

Monto Contratado: \$1,047,829.24


Residente: I.C. J. JESÚS HERNANDEZ FUENTES

Fin Vigente: jueves, 3 de diciembre de 2020

Monto Ejercido: \$1,047,829.24

Fin Real: jueves, 3 de diciembre de 2020

SEMANA	FECHA	%AVANCE FISICO PROG	%AVANCE FISICO REAL	%AVANCE Financiero
1	26/10/2020	2.88%	3.00%	50.0%
2	02/11/2020	23.91%	25.00%	50.0%
3	09/11/2020	55.94%	60.00%	50.0%
4	16/11/2020	73.10%	78.00%	56.0%
5	23/11/2020	88.69%	91.00%	56.0%
6	30/11/2020	95.85%	97.00%	64.0%
7	07/12/2020	100.00%	100.00%	75.0%
8	14/12/2020	100.00%	100.00%	100.0%

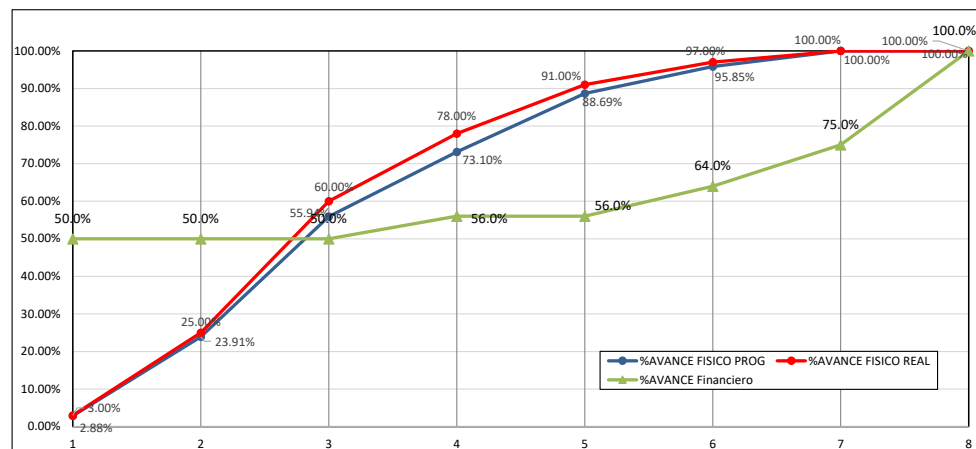

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
