

GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA

Obra: FISMDF 11-008 CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA, TELESECUNDARIA No. 85, HERMENEGILDO GALEANA
 FISMDF 11-007 CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA, J.N. CELESTINO FREINET

Ubicación: LORETITO Y LA GUAYANA

Contrato: FISMDF 005/2020

Tipo de inversión: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2020

Contratista: ARVIL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

Programa: SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Inicio Vigente: lunes, 19 de octubre de 2020

Días de Obra: 45

Subprograma: 02 CONSTRUCCION

Inicio Real: lunes, 19 de octubre de 2020

Monto Contratado: \$1,367,000.00


Residente: I.C. J. JESÚS HERNANDEZ FUENTES

Fin Vigente: miércoles, 2 de diciembre de 2020

Monto Ejercido: \$1,367,000.00

Fin Real: miércoles, 2 de diciembre de 2020

SEMANA	FECHA	%AVANCE FISICO PROG	%AVANCE FISICO REAL	%AVANCE Financiero
1	26/10/2020	2.23%	3.50%	50.0%
2	02/11/2020	19.24%	22.00%	50.0%
3	09/11/2020	46.43%	48.00%	50.0%
4	16/11/2020	65.91%	67.00%	50.0%
5	23/11/2020	78.94%	80.00%	50.0%
6	30/11/2020	87.02%	88.00%	56.0%
7	07/12/2020	100.00%	100.00%	56.0%
8	14/12/2020	100.00%	100.00%	100.0%

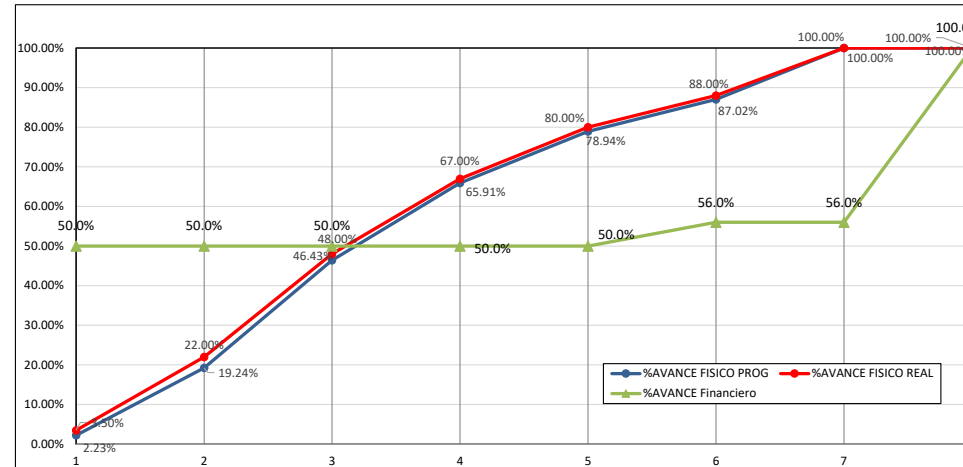

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
