

GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA

Obra: FIS MDF 11-015 CALLE CANADA, FRACC. PANAMERICANO CABECERA MUNICIPAL
(Tramo Calle Hidalgo hasta Calle Uruguay
Tramo Calle Uruguay hasta Calle Bolivia)

Ubicación: CALLE CANADA, FRACC. PANAMERICANO

Contrato: FIS MDF 007/2020

Tipo de inversión: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2020

Contratista: CONSTRUCTORA FLORES HERMANOS, S.A. DE C.V.

Programa: SD ALCANTARILLADO

Inicio Vigente: jueves, 29 de octubre de 2020

Días de Obra: 45

Subprograma: SD ALCANTARILLADO

Inicio Real: jueves, 29 de octubre de 2020

Monto Contratado: \$1,428,754.64


Residente: I.C. J. JESÚS HERNANDEZ FUENTES

Fin Vigente: sábado, 12 de diciembre de 2020

Monto Ejercido: \$1,428,754.64

Fin Real: sábado, 12 de diciembre de 2020

SEMANA	FECHA	%AVANCE FISICO PROG	%AVANCE FISICO REAL	%AVANCE Financiero
1	01/11/2020	8.80%	9.50%	50.0%
2	08/11/2020	25.17%	28.00%	50.0%
3	15/11/2020	53.80%	55.00%	50.0%
4	22/11/2020	70.24%	72.00%	51.8%
5	29/11/2020	83.10%	85.00%	51.8%
6	06/12/2020	92.81%	95.00%	59.0%
7	13/12/2020	100.00%	100.00%	59.0%
8	20/12/2020	100.00%	100.00%	100.0%

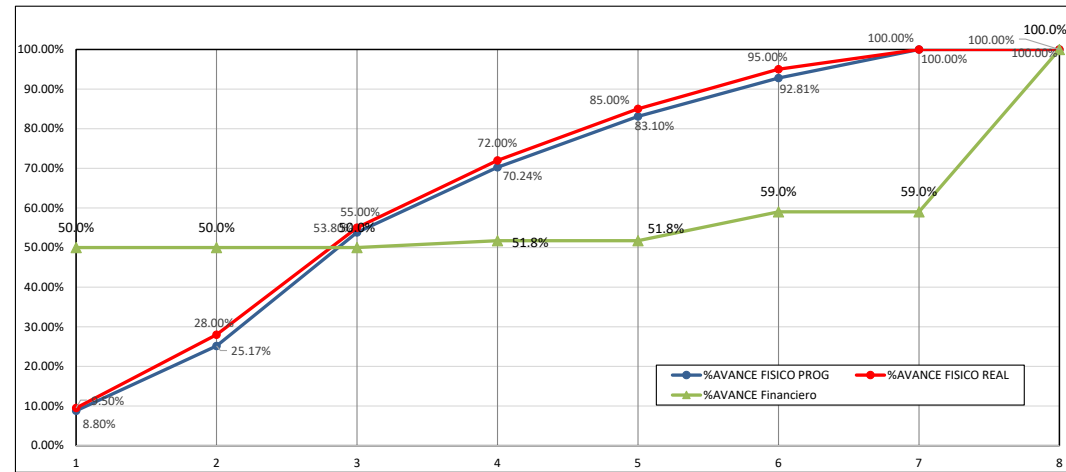

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
