


GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA

Obra: FISMDF 11-014 REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CALLE EMILIO CARRANZA ORIENTE, FRACC. REVOLUCION, CABECERA MUNICIPAL
 FISMDF 11-009 REHABILITACIÓN DE RED O SITEMA DE AGUA POTABLE CALLE EMILIO CARRANZA ORIENTE, FRACC. REVOLUCION, CABECERA MUNICIPAL

Ubicación: CALLE EMILIO CARRANZA ORIENTE, FRACC. REVOLUCION, CABECERA MUNICIPAL	Contrato: FISMDF 008/2020	
Tipo de inversión: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2020	Contratista: MS CONSTRUCCIÓN SOLUCIONES E INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	
Programa: SD ALCANTARILLADO, SC AGUA POTABLE	Inicio Vigente: jueves, 29 de octubre de 2020	Días de Obra: 45
Subprograma: 01 REHABILITACION	Inicio Real: jueves, 29 de octubre de 2020	Monto Contratado: \$1,210,478.72
Residente: I.C. J. JESÚS HERNANDEZ FUENTES	Fin Vigente: sábado, 12 de diciembre de 2020	Monto Ejercido: \$1,210,478.72
	Fin Real: sábado, 12 de diciembre de 2020	

SEMANA	FECHA	%AVANCE FISICO PROG	%AVANCE FISICO REAL	%AVANCE Financiero
1	01/11/2020	3.17%	4.00%	50.0%
2	08/11/2020	26.44%	27.00%	50.0%
3	15/11/2020	39.42%	40.00%	50.0%
4	22/11/2020	65.98%	67.00%	50.0%
5	29/11/2020	84.29%	88.00%	53.0%
6	06/12/2020	97.20%	98.00%	53.0%
7	13/12/2020	100.00%	100.00%	53.0%
8	20/12/2020	100.00%	100.00%	100.0%

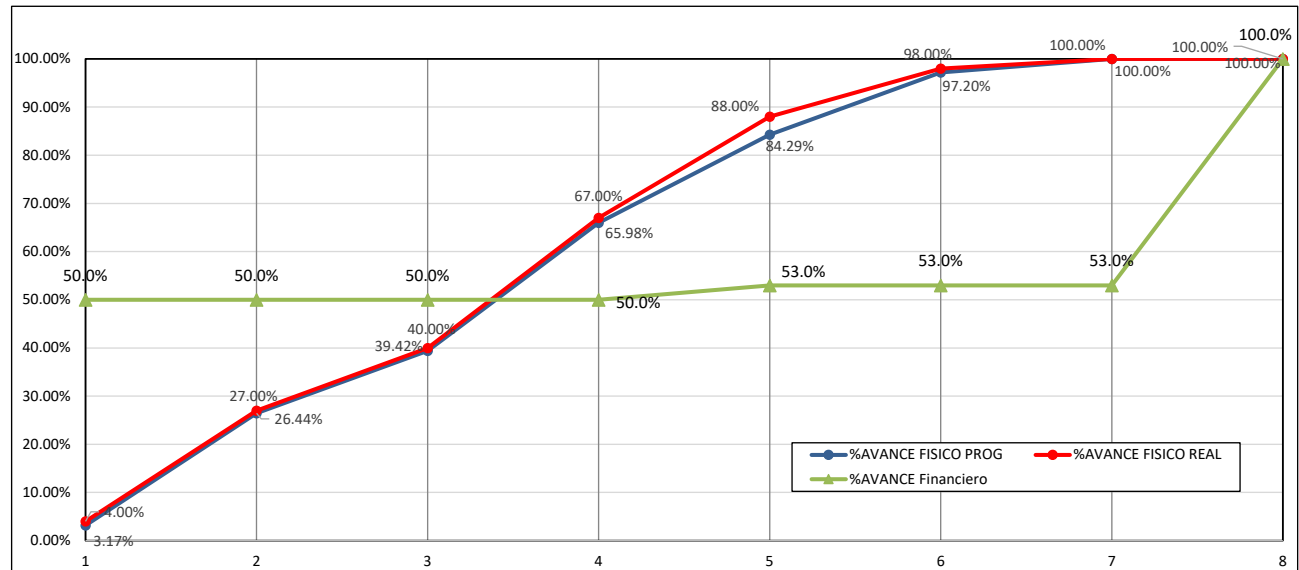

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
