

GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA

Obra: FISMDF 11-013 REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CALLE JOSE MARIA CHAVEZ, FRACC. REVOLUCION, CABECERA MUNICIPAL
FISMDF 11-010 REHABILITACIÓN DE RED O SITEMA DE AGUA POTABLE

Ubicación: CALLE JOSE MARIA CHAVEZ, FRACC. REVOLUCION, CABECERA MUNICIPAL

Contrato: FISMDF 009/2020

Tipo de inversión: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2020

Contratista: INMOBILIARIA TENEXAC, S.A. DE C.V.

Programa: SD ALCANTARILLADO, SC AGUA POTABLE

Inicio Vigente: martes, 3 de noviembre de 2020

Días de Obra: 45

Subprograma: 01 REHABILITACION

Inicio Real: martes, 3 de noviembre de 2020

Monto Contratado: \$1,193,319.90


Residente: I.C. J. JESÚS HERNANDEZ FUENTES

Fin Vigente: jueves, 17 de diciembre de 2020

Monto Ejercido: \$1,193,319.90

Fin Real: jueves, 17 de diciembre de 2020

SEMANA	FECHA	%AVANCE FISICO PROG	%AVANCE FISICO REAL	%AVANCE Financiero
1	09/11/2020	11.96%	15.00%	50.0%
2	16/11/2020	31.07%	35.00%	50.0%
3	23/11/2020	56.48%	60.00%	50.0%
4	30/11/2020	71.87%	75.00%	53.0%
5	07/12/2020	89.97%	91.00%	53.0%
6	14/12/2020	97.10%	98.00%	53.0%
7	21/12/2020	100.00%	100.00%	53.0%
8	28/12/2020	100.00%	100.00%	100.00%

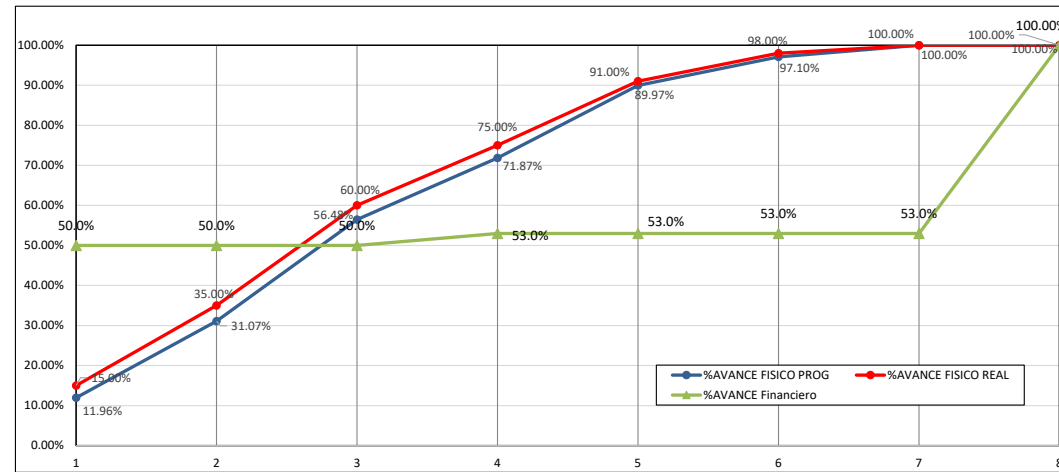

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
