

GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA


Obra: FISMDF 11-012 REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO, CALLE ALDAMA NORTE, FRACC. REVOLUCION

Ubicación: FRACC. REVOLUCION, CABECERA MUNICIPAL
Tipo de inversión: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2020
Programa: SD ALCANTARILLADO,
Subprograma: 01 REHABILITACION
Residente: I.C. J. JESÚS HERNANDEZ FUENTES

Contrato:
Contratista: CONSORCIO INDUSTRIAL INTERNACIONAL AIRE, S.A. DE C.V.
Inicio Vigente: martes, 3 de noviembre de 2020
Inicio Real: martes, 3 de noviembre de 2020
Fin Vigente: jueves, 17 de diciembre de 2020
Fin Real: jueves, 17 de diciembre de 2020

Días de Obra: 45
Monto Contratado: \$1,211,242.03
Monto Ejercido: \$1,211,242.03

SEMANA	FECHA	%AVANCE FISICO PROG	%AVANCE FISICO REAL	%AVANCE Financiero
1	09/11/2020	4.39%	5.00%	50.0%
2	16/11/2020	15.38%	18.00%	50.0%
3	23/11/2020	32.02%	35.00%	50.0%
4	30/11/2020	52.05%	55.00%	50.0%
5	07/12/2020	72.07%	78.00%	72.0%
6	14/12/2020	92.09%	94.00%	72.0%
7	21/12/2020	100.00%	100.00%	72.0%
8	28/12/2020	100.00%	100.00%	100.00%

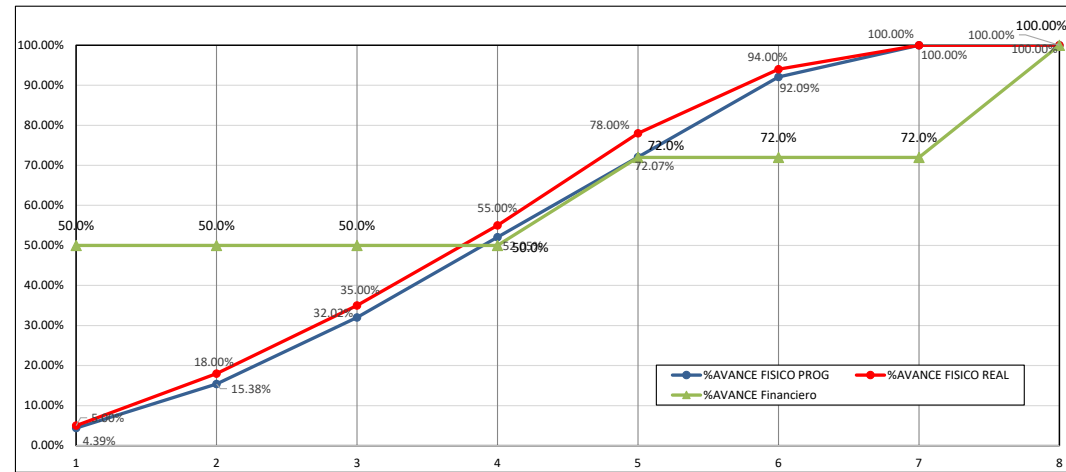

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
