

## GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA


**Obra:** FISMDF 11-006 CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA DE LA E.P. DISTRIBUIDORES NISSAN No. 95

**Ubicación:** FRACC. URBI VILLAS DEL VERGEL  
**Tipo de inversión:** FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2020  
**Programa:** SJ INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA  
**Subprograma:** 02 b) CONSTRUCCION - PRIMARIA  
**Residente:** ARQ. Pedro Antonio Medina Fuentes

**Contrato:** FISMDF 011/2020  
**Contratista:** MAOFRE Grupo Constructor, S.A. de C.V.,  
**Inicio Vigente:** martes, 17 de noviembre de 2020  
**Inicio Real:** martes, 17 de noviembre de 2020  
**Fin Vigente:** miércoles, 16 de diciembre de 2020  
**Fin Real:** miércoles, 16 de diciembre de 2020

**Días de Obra:** 30  
**Monto Contratado:** \$989,000.00  
**Monto Ejercido:** \$989,000.00

SEMANA	FECHA	%AVANCE FISICO PROG	%AVANCE FISICO REAL	%AVANCE Financiero
1	23/11/2020	2.86%	3.50%	50.0%
2	30/11/2020	13.78%	16.00%	50.0%
3	07/12/2020	39.61%	41.00%	74.0%
4	14/12/2020	81.28%	85.00%	74.0%
5	21/12/2020	100.00%	100.00%	100.0%

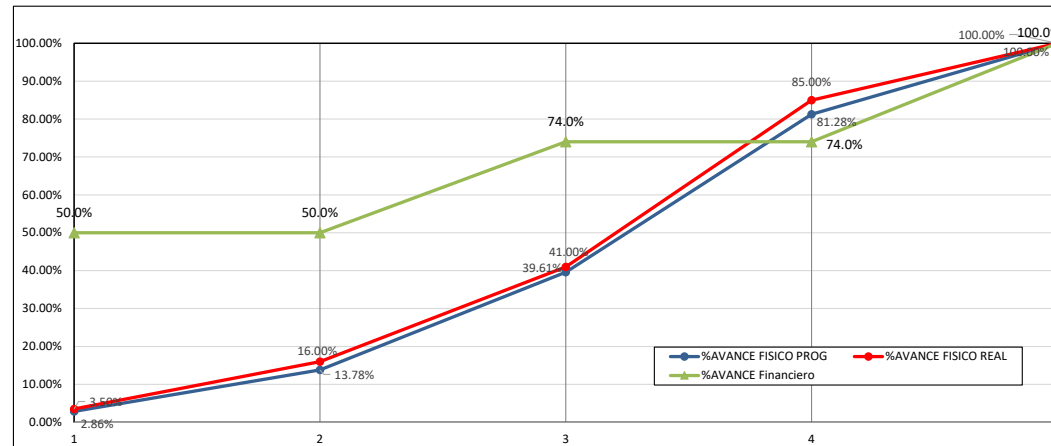

**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO**
