

GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA


Obra: FIS MDF 11-023 CONSTRUCCIÓN DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

Ubicación: TODO EL MUNICIPIO.
Tipo de inversión: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2020
Programa: SH Vivienda Digna
Subprograma: 01 Ampliación de Vivienda
Residente: T.C. FERNANDO LUNA MEDINA

Contrato: FIS MDF 012/2020
Contratista: BUFETE de Construcciones y Servicios del Centro, S.A. de C.V.
Inicio Vigente: martes, 17 de noviembre de 2020
Inicio Real: martes, 17 de noviembre de 2020
Fin Vigente: miércoles, 16 de diciembre de 2020
Fin Real: miércoles, 16 de diciembre de 2020

Días de Obra: 30
Monto Contratado: \$3,168,417.88
Monto Ejercido: \$3,168,417.88

SEMANA	FECHA	%AVANCE FISICO PROG	%AVANCE FISICO REAL	%AVANCE Financiero
1	23/11/2020	12.25%	18.00%	50.0%
2	30/11/2020	36.82%	40.00%	50.0%
3	07/12/2020	61.39%	68.00%	50.0%
4	14/12/2020	85.96%	90.00%	87.3%
5	21/12/2020	100.00%	100.00%	100.0%

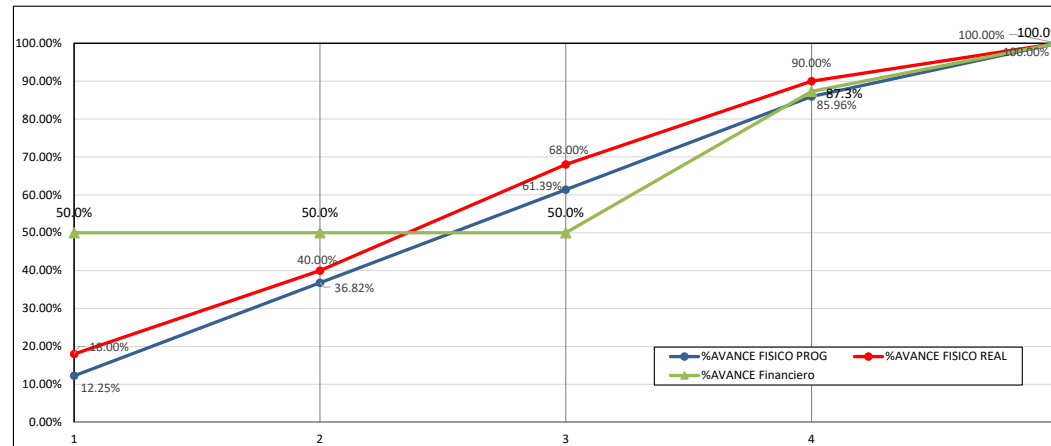

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
