

GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA


Obra: **FISMDF 11-025 Mejoramiento de Viviendas.-Construcción de Calentadores Solares**

Ubicación: Zona Sur
Tipo de inversión: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2020
Programa: SH Vivivenda Digna
Subprograma: 01 Ampliación de Vivienda
Residente: T.C. FERNANDO LUNA MEDINA

Contrato: FISMDF 013/2020
Contratista: Comercializadora ECOTEMPER, S. de R.L. de C.V.
Inicio Vigente: miércoles, 16 de diciembre de 2020
Inicio Real: miércoles, 16 de diciembre de 2020
Fin Vigente: miércoles, 30 de diciembre de 2020
Fin Real: miércoles, 30 de diciembre de 2020

Días de Obra: 15
Monto Contratado: \$1,487,283.30
Monto Ejercido: \$1,487,283.30

SEMANA	FECHA	%AVANCE FISICO PROG	%AVANCE FISICO REAL	%AVANCE Financiero
1	21/12/2020	38.00%	40.00%	50.0%
2	28/12/2020	82.00%	88.00%	50.0%
2	04/01/2021	100.00%	100.00%	100.0%

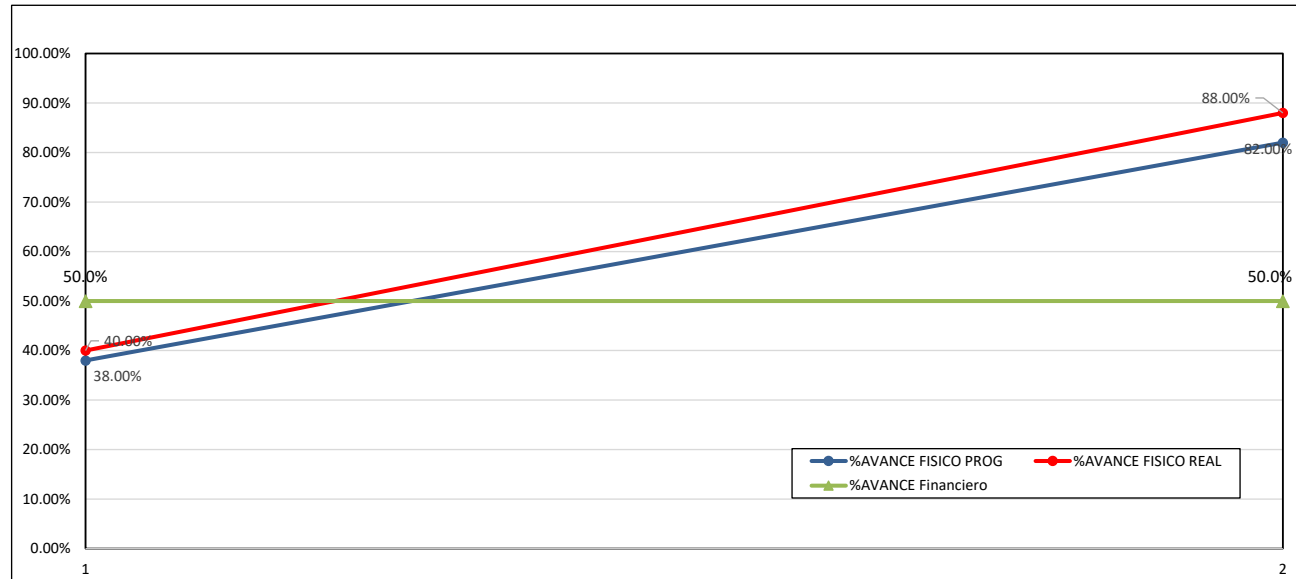

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
