

## GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA


**Obra:** FIS MDF 11-025 Mejoramiento de Viviendas.-Construcción de Calentadores Solares

**Ubicación:** Zona Norte-Centro  
**Tipo de inversión:** FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2020  
**Programa:** SH Vivienda Digna  
**Subprograma:** 03 Construcción  
**Residente:** T.C. Fernando Luna Medina

**Contrato:** FIS MDF 014/2020  
**Contratista:** CERICA Construcciones, S.A. de C.V.  
**Inicio Vigente:** miércoles, 16 de diciembre de 2020  
**Inicio Real:** miércoles, 16 de diciembre de 2020  
**Fin Vigente:** miércoles, 30 de diciembre de 2020  
**Fin Real:** miércoles, 30 de diciembre de 2020

**Días de Obra:** 15  
**Monto Contratado:** \$1,292,447.64  
**Monto Ejercido:** \$1,292,447.64

SEMANA	FECHA	%AVANCE FISICO PROG	%AVANCE FISICO REAL	%AVANCE Financiero
1	21/12/2020	45.85%	52.00%	50.0%
2	28/12/2020	91.66%	93.00%	50.0%
2	04/01/2021	100.00%	100.00%	100.0%

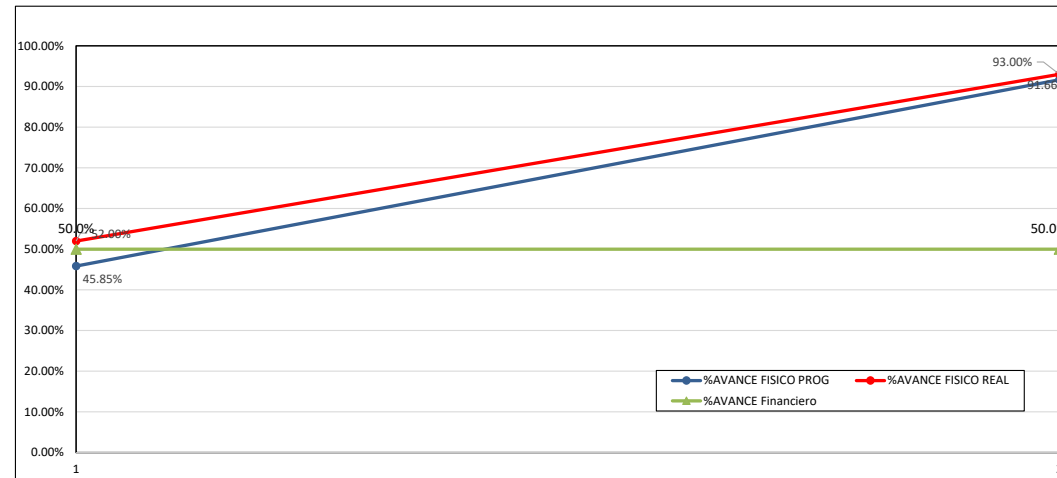

**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO**
