

## GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA

**PFR 003/20 REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE VARIAS CALLES**


**Obra:**

**Ubicación:** CABECERA MUNICIPAL  
**Tipo de inversión:** PARTICIPACIONES FEDERALES REMANENTE 2019  
**Programa:** SD/ SC ALCANTARILLADO / AGUA POTABLE  
**Subprograma:** 01 REHABILITACION  
**Residente:** T.C. FERNANDO LUNA MEDINA

**Contrato:** PFR002/2020  
**Contratista:** CONSTRUCTORA FLORES HERMANOS, S.A. DE C.V.  
**Inicio Vigente:** lunes, 22 de junio de 2020  
**Inicio Real:** sábado, 20 de junio de 2020  
**Fin Vigente:** martes, 18 de agosto de 2020  
**Fin Real:** martes, 18 de agosto de 2020

**Días de Obra:** 60 días  
**Monto Contratado:** \$ 1,090,000.00  
**Monto Ejercido:** \$ 1,090,000.00

SEMANA	FECHA	%AVANCE FISICO PROG	%AVANCE FISICO REAL	%AVANCE Financiero
1	29/06/2020	5.29%	7.50%	50.0%
2	06/07/2020	11.93%	14.00%	62.0%
3	13/07/2020	22.50%	25.00%	62.0%
4	20/07/2020	37.79%	39.00%	62.0%
5	27/07/2020	49.94%	52.00%	62.0%
6	03/08/2020	57.16%	60.00%	89.0%
7	10/08/2020	73.93%	75.00%	89.0%
8	17/08/2020	87.58%	88.00%	99.0%
9	24/08/2020	100.00%	100.00%	99.0%
10	31/08/2020	100.00%	100.00%	99.0%
11	07/09/2020	100.00%	100.00%	99.0%
12	14/09/2020	100.00%	100.00%	99.0%
13	21/09/2020	100.00%	100.00%	99.0%
14	28/09/2020	100.00%	100.00%	100.0%

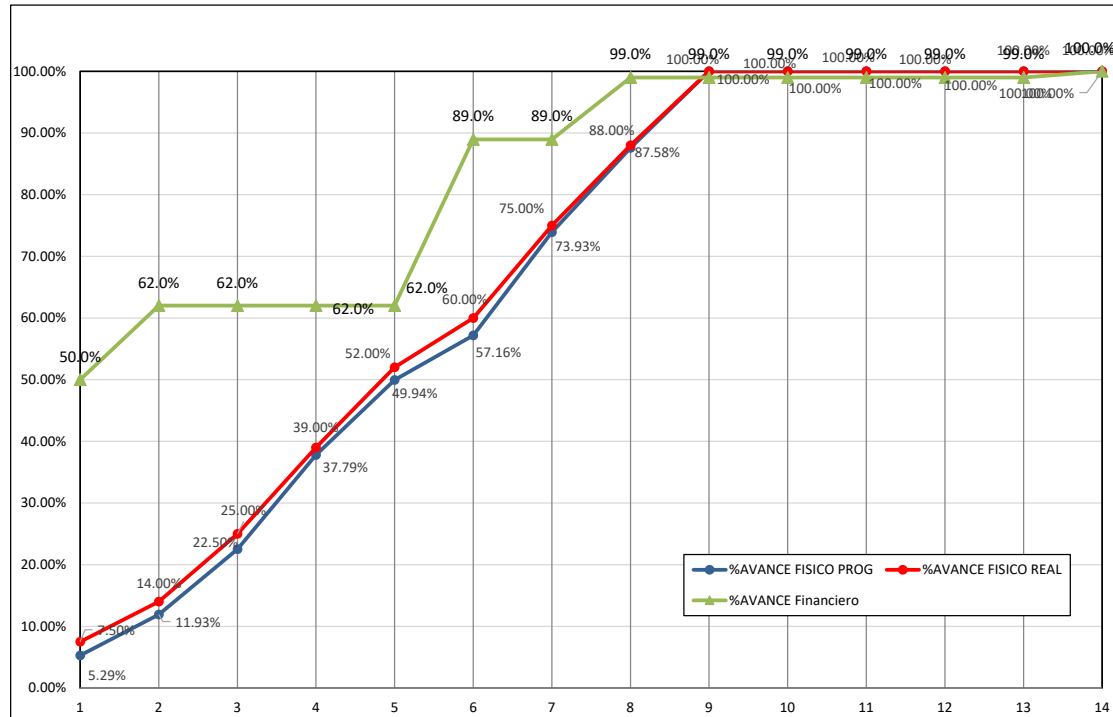

**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO**
