

GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA

PFR 002/20 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN PARQUE LA GUAYANA


Obra:

Ubicación: LA GUAYANA
Tipo de inversión: PARTICIPACIONES FEDERALES REMANENTE 2019
Programa: SE URBANIZACION
 07c) PARQUES PUBLICOS Y RECREATIVOS.- CONSTRUCCION
Subprograma:
Residente: ARQ.PEDRO ANTONIO MEDINA FUENTES

Contrato: PFR 003/2020
Contratista: I.C. Cesar Alexis Muñoz Gómez
Inicio Vigente: lunes, 29 de junio de 2020
Inicio Real: lunes, 29 de junio de 2020
Fin Vigente: jueves, 27 de agosto de 2020
Fin Real: jueves, 27 de agosto de 2020

Días de Obra: 60 días
Monto Contratado: \$ 1,440,000.00
Monto Ejercido: \$ 1,440,000.00

SEMANA	FECHA	%AVANCE FISICO PROG	%AVANCE FISICO REAL	%AVANCE Financiero
1	06/07/2020	4.46%	5.50%	50.0%
2	13/07/2020	11.69%	15.00%	50.0%
3	20/07/2020	15.82%	18.00%	50.0%
4	27/07/2020	41.61%	46.00%	50.0%
5	03/08/2020	67.39%	70.00%	50.0%
6	10/08/2020	91.58%	95.00%	55.8%
7	17/08/2020	96.44%	97.00%	82.5%
8	24/08/2020	98.90%	99.00%	82.5%
9	31/08/2020	100.00%	100.00%	82.5%
10	07/09/2020	100.00%	100.00%	82.5%
11	14/09/2020	100.00%	100.00%	100.0%

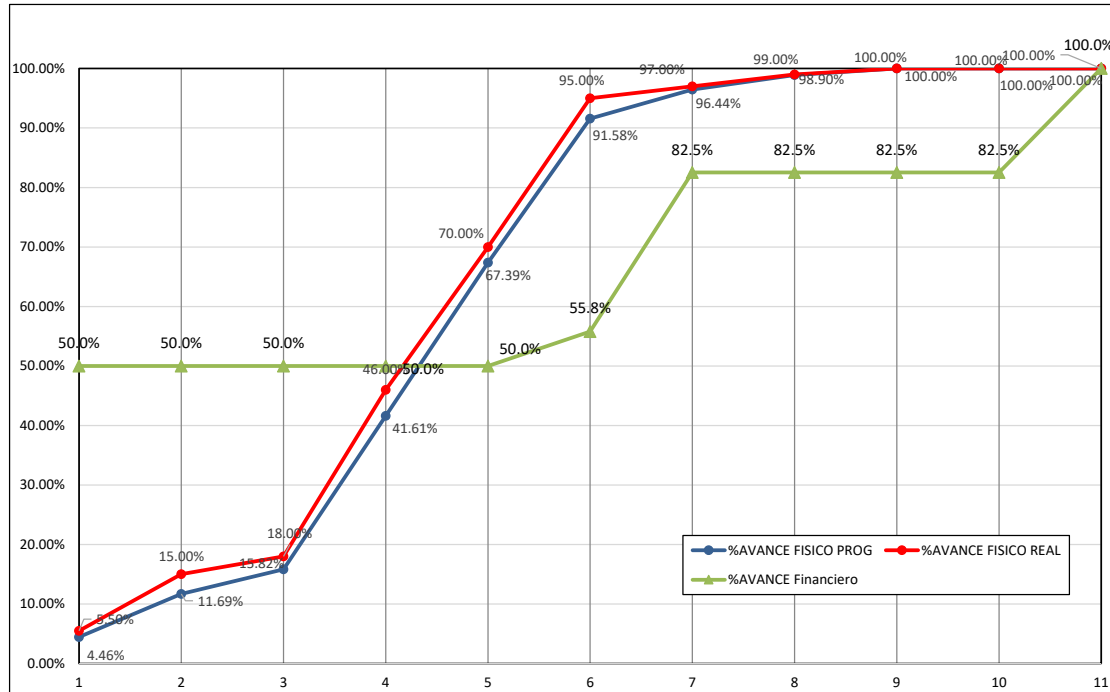

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
