


GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA

PFR 004/20 REHABILITACIÓN DE PARQUES DE BEISBOL

Obra:

Ubicación: VARIAS COMUNIDADES MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO	Contrato: PFR 005/2020	
Tipo de inversión: PARTICIPACIONES FEDERALES REMANENTE 2019	Contratista: Conestructura, S.A. de C.V.	
Programa: SL INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	Inicio Vigente: lunes, 28 de septiembre de 2020	Días de Obra: 60 DIAS
Subprograma: 01 REHABILITACIÓN	Inicio Real: lunes, 28 de septiembre de 2020	Monto Contratado: \$ 1,053,255.48
Residente: I.C. CARLOS ARMANDO CHAVEZ GARCÍA	Fin Vigente: jueves, 26 de noviembre de 2020	Monto Ejercido: \$ 1,075,000.00
	Fin Real: jueves, 26 de noviembre de 2020	

SEMANA	FECHA	%AVANCE FISICO PROG	%AVANCE FISICO REAL	%AVANCE Financiero
1	05/10/2020	4.35%	5.20%	50.0%
2	12/10/2020	9.65%	10.00%	50.0%
3	19/10/2020	26.07%	28.00%	50.0%
4	26/10/2020	41.88%	45.00%	61.1%
5	02/11/2020	62.35%	65.00%	61.1%
6	09/11/2020	71.70%	74.00%	61.1%
7	16/11/2020	84.96%	86.00%	83.7%
8	23/11/2020	92.84%	95.00%	83.7%
9	30/11/2020	100.00%	100.00%	96.0%
10	07/12/2020	100.00%	100.00%	96.0%
11	14/12/2020	100.00%	100.00%	100.0%

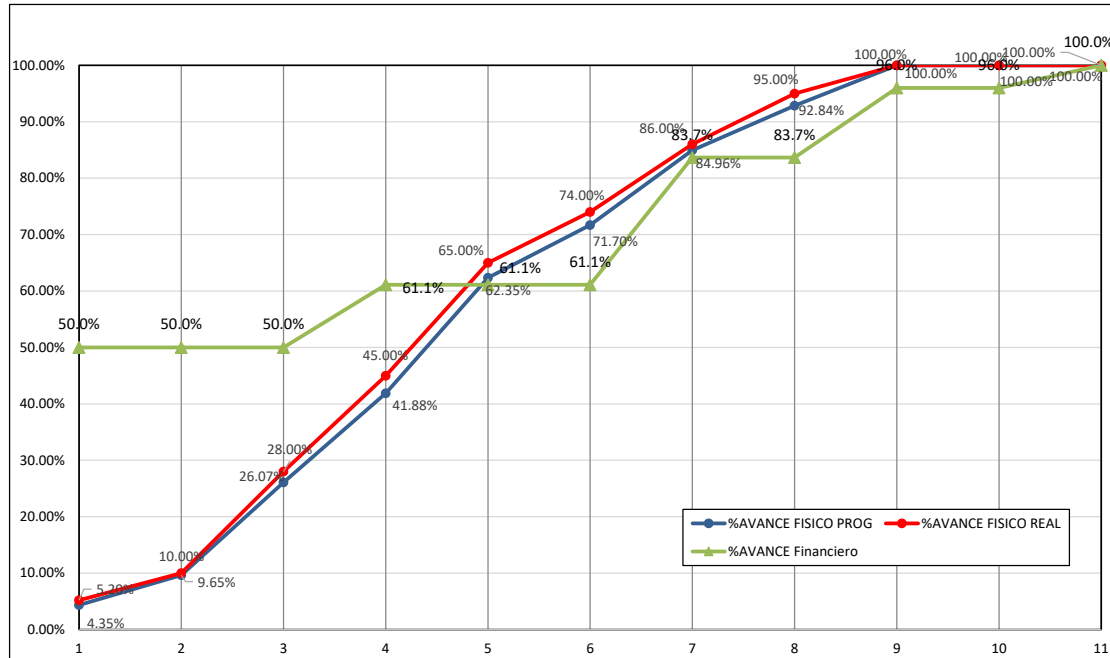

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
