

GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA

Obra: FR 002/20 CONSTRUCCIÓN DE PÓRTICO Y REJA PERÍMETRAL EN TELESECUNDARIA #179, QUETZALCOATL
PFR 007 REHABILITACIÓN DE COMANDANCIA.-CABECERA MUNICIPAL

Ubicación: CABECERA MUNICIPAL

Contrato: FR/001 - PFR 006/2020

Tipo de inversión: PARTICIPACIONES FEDERALES REMANENTE 2019
FONDO RESARCITORIO 2020

Contratista: EQUIPOS AK, S.A. DE C.V.

Programa: DA EDIFICIOS PÚBLICOS
SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
01 REHABILITACIÓN

Inicio Vigente: miércoles, 25 de noviembre de 2020

Días de Obra: 21 DIAS

Subprograma: 02 B) CONSTRUCCIÓN - PRIMARIA

Inicio Real: miércoles, 25 de noviembre de 2020

Monto Contratado: \$ 700,000.00


Residente: I.C. CARLOS ARMANDO CHAVEZ GARCÍA

Fin Vigente: martes, 15 de diciembre de 2020

Monto Ejercido: \$ 700,000.00

Fin Real: martes, 15 de diciembre de 2020

SEMANA	FECHA	%AVANCE FÍSICO PROG	%AVANCE FÍSICO REAL	%AVANCE Financiero
1	30/11/2020	8.75%	9.50%	0.0%
2	07/12/2020	60.54%	72.00%	0.0%
3	14/12/2020	98.90%	99.00%	0.0%
4	21/12/2020	100.00%	100.00%	100.0%

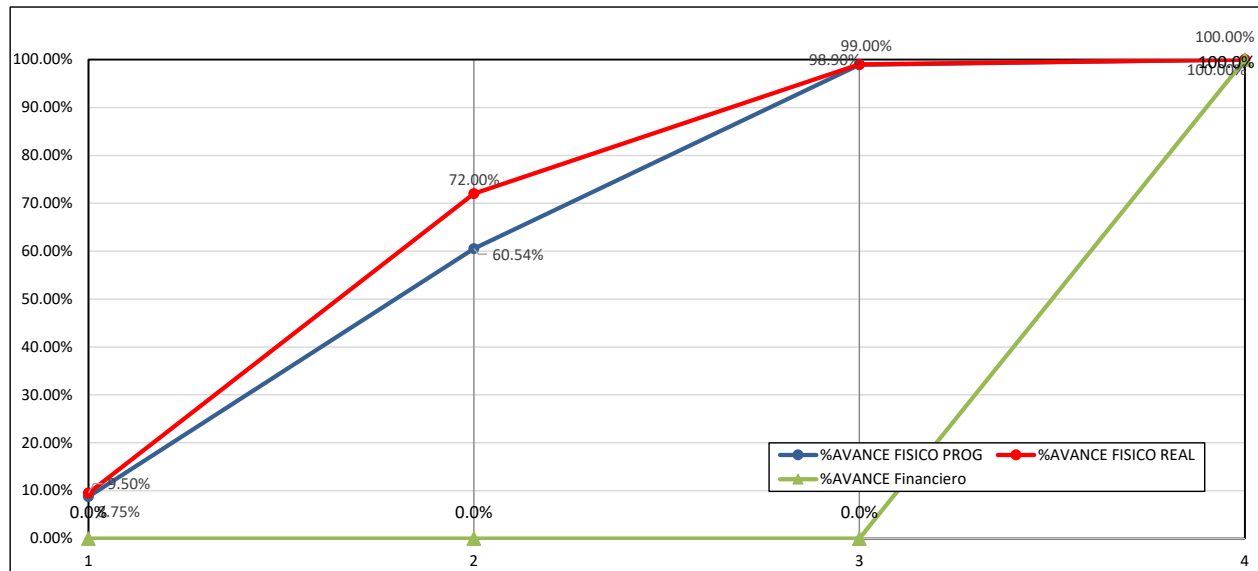

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
