


GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA

| | | | | | |
|---------------------------|--|------------------------|--------------------------------------|--------------------------|---------------|
| Obra: | DM 001/20 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, DE INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS | | | | |
| Ubicación: | TODO EL MUNICIPIO | Contrato: | DM 001/2020 | | |
| Tipo de inversión: | DIRECTO MUNICIPAL 2020 | Contratista: | Ing. Ángel de Jesús Ramírez Guardado | | |
| Programa: | U9 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO REGIONAL | Inicio Vigente: | viernes, 12 de junio de 2020 | Días de Obra: | 190 días |
| Subprograma: | 01, 03 ESTUDIOS Y PROYECTOS, SERVICIOS | Inicio Real: | lunes, 22 de junio de 2020 | Monto Contratado: | \$ 249,956.80 |
| Residentes: | ARQ. PEDRO ANTONIO MEDINA FUENTES | Fin Vigente: | viernes, 18 de diciembre de 2020 | Monto Ejercido: | \$ 249,956.80 |
| | | Fin Real: | viernes, 18 de diciembre de 2020 | | |

| SEMANA | FECHA | %AVANCE FISICO PROG | %AVANCE FISICO REAL | %AVANCE Financiero |
|--------|------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 1 | 15/06/2020 | 29.89% | 30.00% | 0.0% |
| 2 | 22/06/2020 | 33.41% | 34.00% | 0.0% |
| 3 | 29/06/2020 | 34.78% | 35.00% | 0.0% |
| 4 | 06/07/2020 | 37.52% | 38.00% | 0.0% |
| 5 | 13/07/2020 | 38.89% | 40.00% | 0.0% |
| 6 | 20/07/2020 | 40.26% | 42.00% | 0.0% |
| 7 | 27/07/2020 | 43.00% | 45.00% | 0.0% |
| 8 | 03/08/2020 | 45.74% | 47.00% | 0.0% |
| 9 | 10/08/2020 | 48.47% | 49.00% | 0.0% |
| 10 | 17/08/2020 | 49.94% | 50.00% | 0.0% |
| 11 | 24/08/2020 | 52.58% | 55.00% | 0.0% |
| 12 | 31/08/2020 | 55.32% | 56.00% | 0.0% |
| 13 | 07/09/2020 | 58.06% | 59.00% | 0.0% |
| 14 | 14/09/2020 | 59.43% | 60.00% | 0.0% |
| 16 | 21/09/2020 | 62.16% | 63.00% | 0.0% |
| 16 | 28/09/2020 | 64.90% | 65.00% | 0.0% |
| 17 | 05/10/2020 | 67.64% | 68.00% | 0.0% |
| 18 | 12/10/2020 | 69.01% | 70.00% | 0.0% |
| 19 | 19/10/2020 | 71.75% | 72.00% | 0.0% |
| 20 | 26/10/2020 | 74.48% | 75.00% | 0.0% |
| 21 | 02/11/2020 | 75.85% | 77.00% | 0.0% |
| 22 | 09/11/2020 | 79.96% | 80.00% | 0.0% |
| 23 | 16/11/2020 | 82.70% | 83.00% | 0.0% |
| 24 | 23/11/2020 | 84.07% | 85.00% | 0.0% |
| 26 | 30/11/2020 | 85.44% | 87.00% | 0.0% |
| 26 | 07/12/2020 | 85.44% | 88.00% | 0.0% |
| 27 | 14/12/2020 | 95.00% | 97.00% | 0.0% |
| 28 | 21/12/2020 | 100.00% | 100.00% | 100.0% |

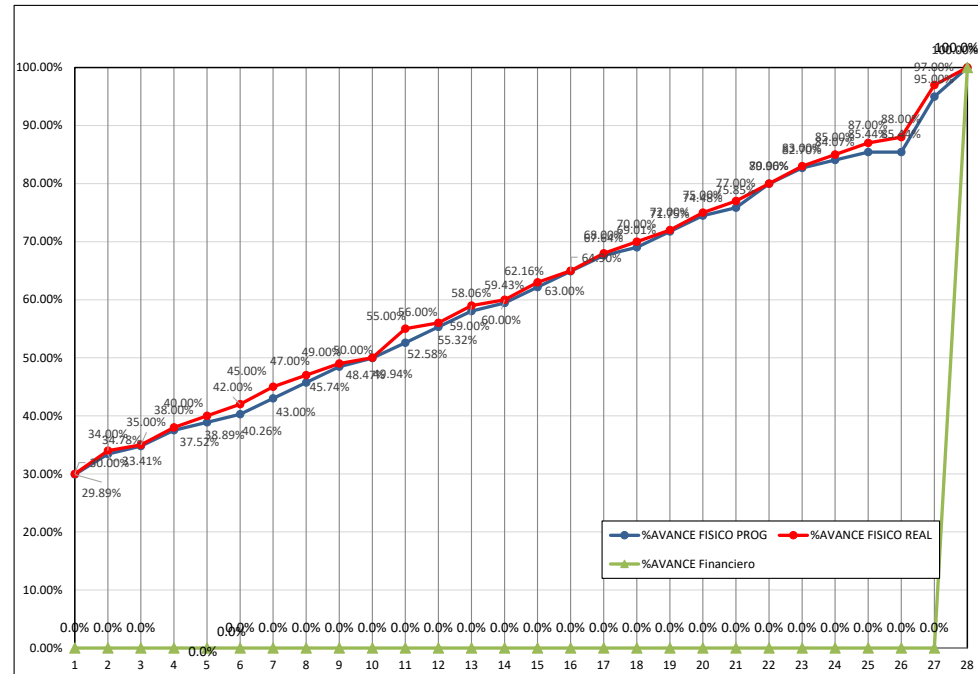

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
