


GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA

Obra:	FISMDF 11-999 SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA (TRAMITE DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN Y PERITO RESPONSABLE DE LAS OBRAS DEL FISMDF)		
Ubicación:	TODO EL MUNICIPIO	Contrato:	FISMDF 001/2020
Tipo de inversión:	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2020	Contratista:	Proyectos SIGMA, S.A. de C.V
Programa:	U9 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO REGIONAL	Inicio Vigente:	sábado, 19 de septiembre de 2020
Subprograma:	01, 03 ESTUDIOS Y PROYECTOS, SERVICIOS	Inicio Real:	sábado, 19 de septiembre de 2020
Residente:	I.C. J. JESÚS HERNANDEZ FUENTES	Fin Vigente:	jueves, 17 de diciembre de 2020
		Fin Real:	jueves, 17 de diciembre de 2020
		Días de Obra:	90
		Monto Contratado:	\$250,000.00
		Monto Ejercido:	\$250,000.00

SEMANA	FECHA	%AVANCE FISICO PROG	%AVANCE FISICO REAL	%AVANCE Financiero
1	21/09/2020	7.15%	10.00%	0.0%
2	28/09/2020	14.00%	15.00%	0.0%
3	05/10/2020	21.45%	22.00%	0.0%
4	12/10/2020	28.60%	30.00%	0.0%
5	19/10/2020	35.75%	37.00%	17.8%
6	26/10/2020	42.90%	45.00%	17.8%
7	02/11/2020	50.05%	52.00%	17.8%
8	09/11/2020	57.20%	60.00%	17.8%
9	16/11/2020	64.35%	66.00%	17.8%
10	23/11/2020	71.50%	74.00%	17.8%
11	30/11/2020	78.65%	80.00%	17.8%
12	07/12/2020	85.80%	88.00%	17.8%
13	14/12/2020	92.95%	95.00%	17.8%
14	21/12/2020	100.00%	100.00%	55.3%
16	28/12/2020	100.00%	100.00%	55.3%
16	04/01/2021	100.00%	100.00%	55.3%

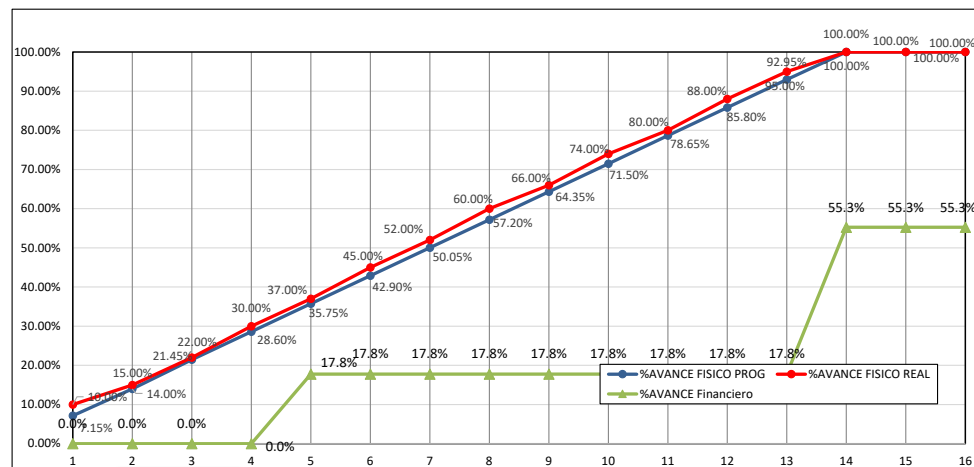

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
