


GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA

Obra:	FISMDF 11-011 REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE, CALLE ALDAMA NORTE (TRAMO CALLE VICENTE GUERRERO ORIENTE HASTA JOSE MARIA CHAVEZ)	Contrato:	FISMDF 002/2020
Ubicación:	FRACC. REVOLUCION	Contratista:	TERESA URBANIZADORA, S.A. DE C.V.
Tipo de inversión:	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2020	Inicio Vigente:	lunes, 26 de octubre de 2020
Programa:	SC AGUA POTABLE	Días de Obra:	45
Subprograma:	01 REHABILITACION	Inicio Real:	lunes, 26 de octubre de 2020
Residente:	I.C. J. JESÚS HERNANDEZ FUENTES	Fin Vigente:	miércoles, 9 de diciembre de 2020
		Fin Real:	miércoles, 9 de diciembre de 2020
		Monto Contratado:	\$631,143.40
		Monto Ejercido:	\$631,143.40

SEMANA	FECHA	%AVANCE FISICO PROG	%AVANCE FISICO REAL	%AVANCE Financiero
1	02/10/2020	16.66%	18.00%	50.0%
2	09/10/2020	30.70%	35.00%	50.0%
3	16/10/2020	59.58%	62.00%	50.0%
4	23/10/2020	74.98%	78.00%	50.0%
5	30/10/2020	85.65%	88.00%	50.0%
6	06/11/2020	99.70%	99.80%	50.0%
7	13/11/2020	100.00%	100.00%	50.0%
8	20/11/2020	100.00%	100.00%	50.0%
9	27/11/2020	100.00%	100.00%	50.0%
10	04/12/2020	100.00%	100.00%	50.0%
11	11/12/2020	100.00%	100.00%	50.0%
12	18/12/2020	100.00%	100.00%	66.2%
13	25/12/2020	100.00%	100.00%	66.2%
14	01/01/2021	100.00%	100.00%	66.2%

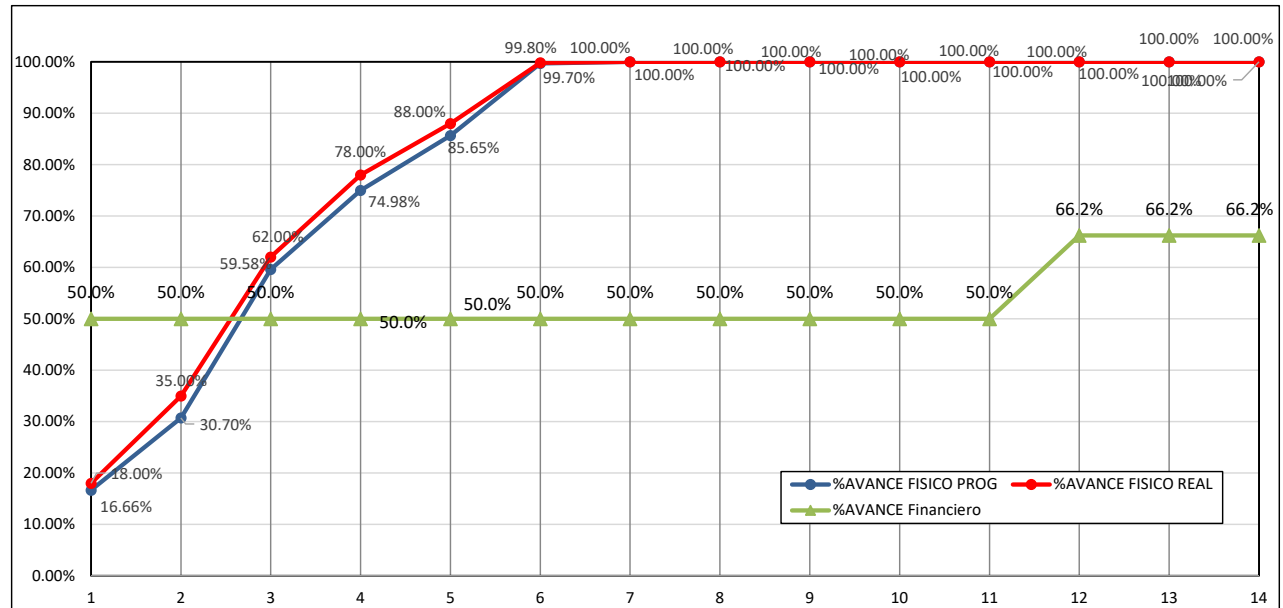

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
