

## GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA

**Obra:** FISMDF 11-017, CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO, CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO,  
FISMDF 11-018 COSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE  
FISMDF 11-019 REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE,

**Ubicación:** CALLE INDEPENDENCIA LA GUAYANA

**Contrato:** FISMDF 003/2020

**Tipo de inversión:** FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2020

**Contratista:**

**Programa:** SD ALCANTARILLADO,  
SF PAVIMENTO EN COLONIAS POPULARES,  
SC AGUA POTABLE

**Inicio Vigente:** viernes, 23 de octubre de 2020

**Días de Obra:** 45

**Subprograma:** 03 CONSTRUCCION, 01 CONCRETO

**Inicio Real:** viernes, 23 de octubre de 2020

**Monto Contratado:** \$464,606.90


**Residente:** Ing.Carlos Armando Chávez García

**Fin Vigente:** domingo, 6 de diciembre de 2020

**Monto Ejercido:** \$464,606.90

**Fin Real:** domingo, 6 de diciembre de 2020

SEMANA	FECHA	%AVANCE FISICO PROG	%AVANCE FISICO REAL	%AVANCE Financiero
1	26/10/2020	1.51%	2.00%	50.0%
2	02/11/2020	9.04%	10.00%	50.0%
3	09/11/2020	22.07%	25.00%	50.0%
4	16/11/2020	45.40%	50.00%	50.0%
5	23/11/2020	69.31%	72.00%	50.0%
6	30/11/2020	84.44%	85.00%	50.0%
7	07/12/2020	100.00%	100.00%	50.0%
8	14/12/2020	100.00%	100.00%	61.9%
9	21/12/2020	100.00%	100.00%	100.0%

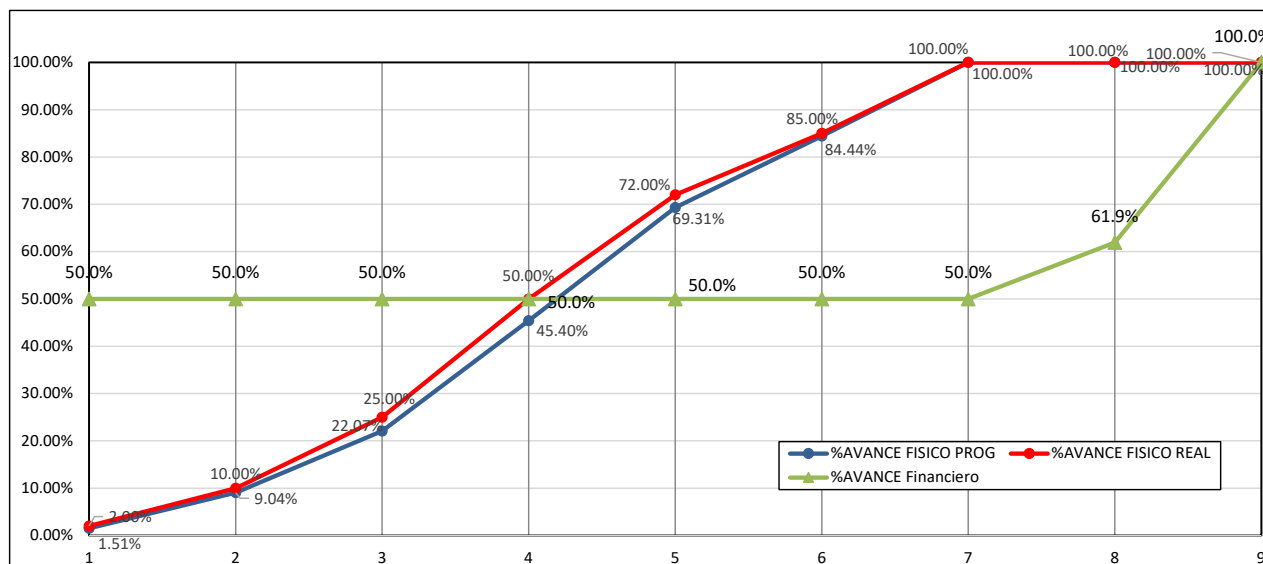

**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO**
