

GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA


Obra: FISMDF 11-020 CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS

Ubicación: LA CONCEPCION
Tipo de inversión: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2020
Programa: SE URBANIZACION
Subprograma: 03 GUARNICIONES Y BANQUETAS
Residente: I.C. J. JESÚS HERNANDEZ FUENTES

Contrato: FISMDF 006/2020
Contratista: C. I.C. Azael Jarib Cordova Huerta
Inicio Vigente: lunes, 26 de octubre de 2020
Inicio Real: lunes, 26 de octubre de 2020
Fin Vigente: miércoles, 9 de diciembre de 2020
Fin Real: miércoles, 9 de diciembre de 2020

Días de Obra: 45
Monto Contratado: \$676,316.66
Monto Ejercido: \$676,316.66

SEMANA	FECHA	%AVANCE FISICO PROG	%AVANCE FISICO REAL	%AVANCE Financiero
1	02/11/2020	17.82%	20.00%	50.0%
2	09/11/2020	34.18%	35.00%	50.0%
3	16/11/2020	54.85%	60.00%	50.0%
4	23/11/2020	75.53%	77.00%	50.0%
5	30/11/2020	96.21%	98.00%	71.5%
6	07/12/2020	100.00%	100.00%	86.9%
7	14/12/2020	100.00%	100.00%	86.9%
8	21/12/2020	100.00%	100.00%	100.0%

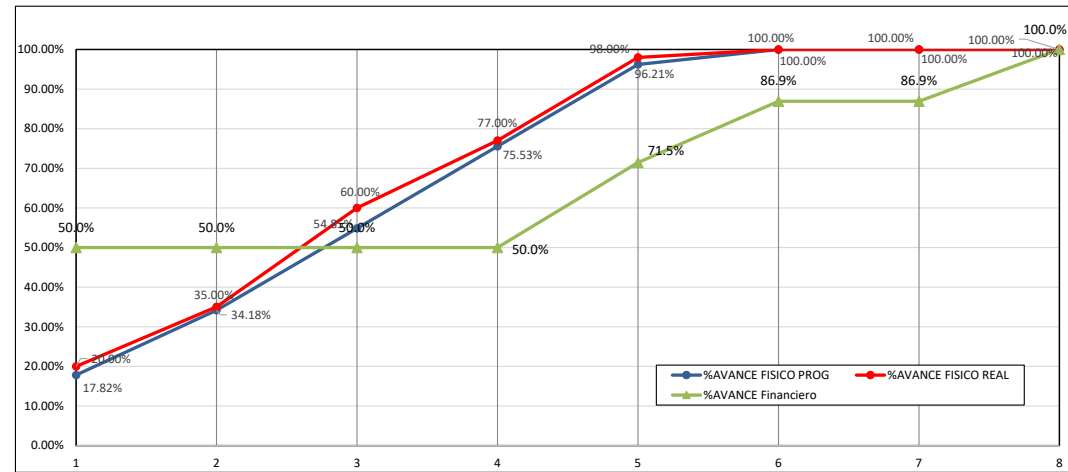

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
