

## GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA

**Obra:** FIS MDF 11-999 SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA  
(PRUEBAS DE LABORATORIO PARA OBRAS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL)

**Ubicación:** TODO EL MUNICIPIO

**Contrato:** FIS MDF 016/2020

**Tipo de inversión:** FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2020

**Contratista:** Ingeniería, Proyecto y Control de Obra, S. de R.L. de C.V.

**Programa:** U9 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO REGIONAL

**Inicio Vigente:** martes, 27 de octubre de 2020

**Días de Obra:** 65

**Subprograma:** 01, 03 ESTUDIOS Y PROYECTOS, SERVICIOS

**Inicio Real:** martes, 27 de octubre de 2020

**Monto Contratado:** \$169,646.15


**Residente:** I.C. J. JESÚS HERNANDEZ FUENTES

**Fin Vigente:** jueves, 31 de diciembre de 2020

**Monto Ejercido:** \$169,646.15

**Fin Real:** jueves, 31 de diciembre de 2020

SEMANA	FECHA	%AVANCE FISICO PROG	%AVANCE FISICO REAL	%AVANCE Financiero
1	02/11/2020	10.00%	12.00%	50.0%
2	09/11/2020	20.00%	24.00%	50.0%
3	16/11/2020	30.00%	35.00%	50.0%
4	23/11/2020	40.00%	44.00%	50.0%
5	30/11/2020	50.00%	58.00%	50.0%
6	07/12/2020	60.00%	63.00%	50.0%
7	14/12/2020	70.00%	78.00%	60.00%
8	21/12/2020	80.00%	88.00%	60.00%
9	28/12/2020	90.00%	95.00%	60.00%
10	04/01/2021	100.00%	100.00%	100.00%

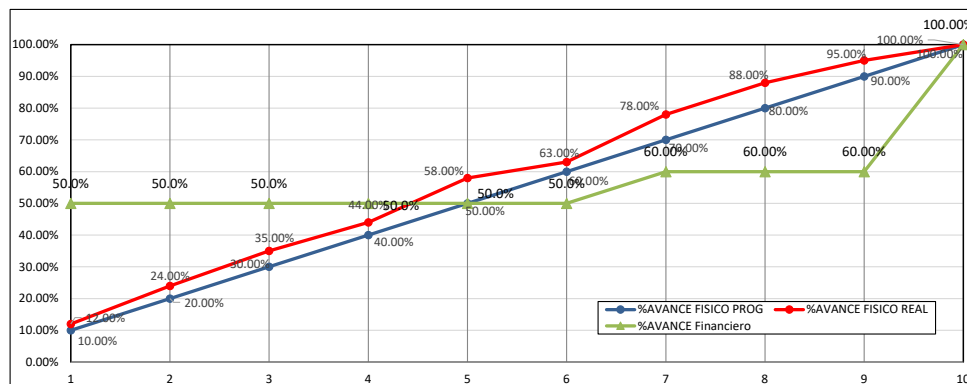

**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO**
