

GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA

Obra: **FISMDF 11-026 Construcción de Mejoramiento de Vivienda del Municipio de San Francisco de los Romo (Cuartos dormitorios)**

Ubicación: TODO EL MUNICIPIO

Contrato: FISMDF 017/2020

Tipo de inversión: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2020

Contratista: BUFETE de Construcciones y Servicios del Centro, S.A. de C.V

Programa: SH Vivivenda Digna

Inicio Vigente: sábado, 19 de diciembre de 2020

Días de Obra: 8

Subprograma: 01 Ampliación de Vivienda

Inicio Real: sábado, 19 de diciembre de 2020

Monto Contratado: \$228,181.25


Residente: T.C. Fernando Luna Medina

Fin Vigente: sábado, 26 de diciembre de 2020

Monto Ejercido: \$228,181.25

Fin Real: sábado, 26 de diciembre de 2020

SEMANA	FECHA	%AVANCE FISICO PROG	%AVANCE FISICO REAL	%AVANCE Financiero
1	21/12/2020	58.00%	61.00%	50.0%
2	28/12/2020	100.00%	100.00%	50.0%
2	04/01/2021	100.00%	100.00%	100.0%

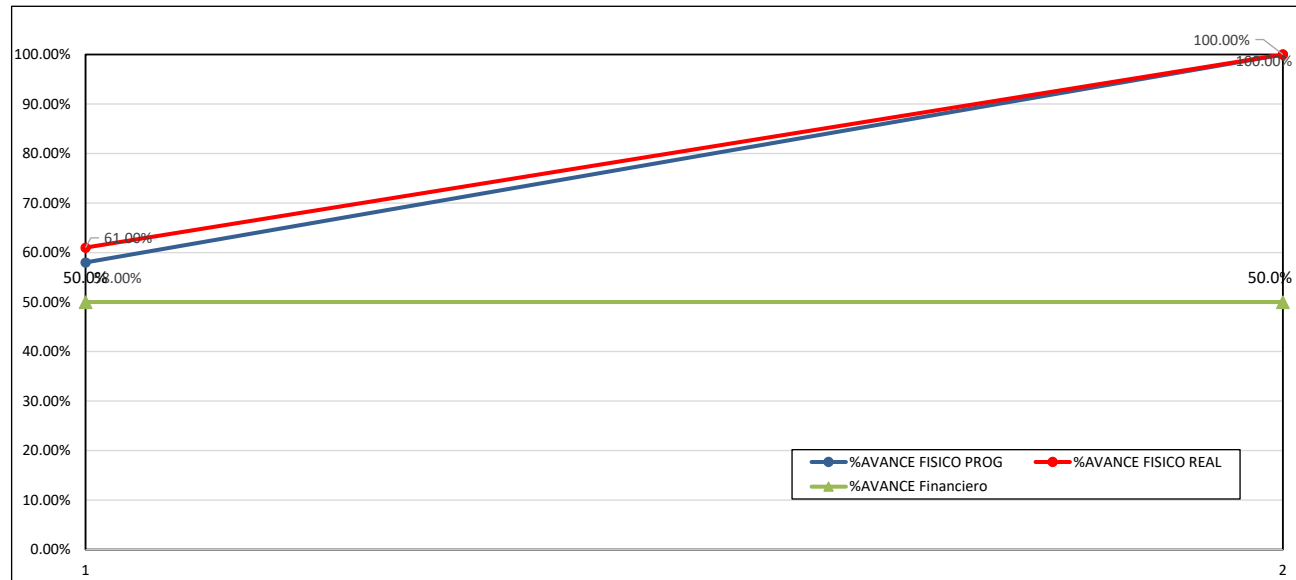

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
