

GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA

Obra:

FRR 001/20 REHABILITACIÓN DE ARROYO VEHICULAR, AV. JUAREZ, TRAMO CALLE ARGENTINA A FCO. I. MADERO

Ubicación:

CABECERA MUNICIPAL, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

Contrato:

FRR 001/2020

Tipo de inversión:

FONDO RESARCITORIO REMANENTE
2019

Contratista:

CONSORCIO INDUSTRIAL INTERNACIONAL AIRE, S.A. DE C.V.

Programa:

SF PAVIMENTACION EN ZONAS POPULARES

Inicio Vigente:

lunes, 13 de abril de 2020

Días de Obra:

21 días

Subprograma:

01 CONCRETO

Inicio Real:

lunes, 13 de abril de 2020

Monto Contratado:

\$ **652,301.58**

Residente:

I.C. J. JESÚS HERNANDEZ FUENTES

Fin Vigente:

domingo, 3 de mayo de 2020


Monto Ejercido:

\$ **636,998.53**

Fin Real:

domingo, 3 de mayo de 2020

SEMANA	FECHA	%AVANCE FISICO PROG	%AVANCE FISICO REAL	%AVANCE Financiero
1	19/04/2020	5.00%	11.80%	0.0%
2	26/04/2020	52.88%	60.00%	0.0%
3	03/05/2020	100.00%	100.00%	0.0%
4	10/05/2020	100.00%	100.00%	97.7%

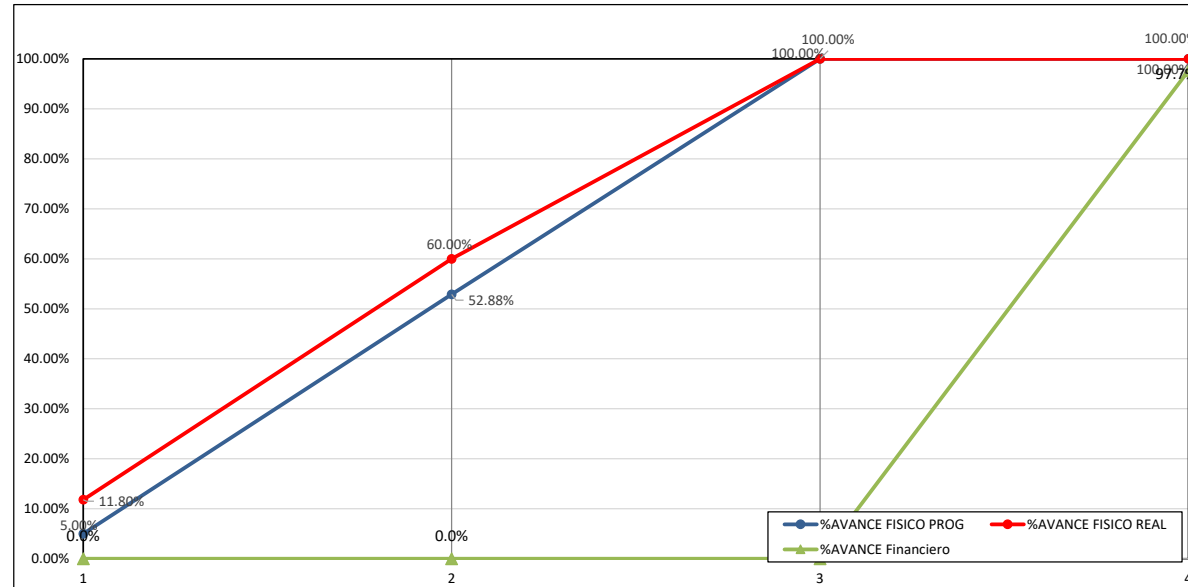

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
