


## GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA

|                           |  |                        |                                |                          |               |
|---------------------------|--|------------------------|--------------------------------|--------------------------|---------------|
| <b>Obra:</b>              | PFR 001/20 CONSTRUCCIÓN DE PÓRTICO Y REJA PERIMETRAL EN E.P. NICOLAS BRAVO |                        |                                |                          |               |
| <b>Ubicación:</b>         | ESCONDIDA  | <b>Contrato:</b>       | PFR 001/2020                   |                          |               |
| <b>Tipo de inversión:</b> | PARTICIPACIONES FEDERALES REMANENTE 2019                                   | <b>Contratista:</b>    | CORACO, S.A. DE C.V            |                          |               |
| <b>Programa:</b>          | SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA   | <b>Inicio Vigente:</b> | miércoles, 17 de junio de 2020 | <b>Días de Obra:</b>     | 30 días       |
| <b>Subprograma:</b>       | 02 b) CONSTRUCCIÓN - PRIMARIA  | <b>Inicio Real:</b>    | miércoles, 17 de junio de 2020 | <b>Monto Contratado:</b> | \$ 510,000.00 |
| <b>Residente:</b>         | ARQ. PEDRO ANONIO MEDINA FUENTES   | <b>Fin Vigente:</b>    | jueves, 16 de julio de 2020    | <b>Monto Ejercido:</b>   | \$ 510,000.00 |
|                           |  | <b>Fin Real:</b>       | jueves, 16 de julio de 2020    |                          |               |

| SEMANA | FECHA      | %AVANCE FISICO PROG | %AVANCE FISICO REAL | %AVANCE Financiero |
|--------|------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 1      | 22/06/2020 | 5.07%               | 7.50%               | 50.0%              |
| 2      | 29/06/2020 | 23.67%              | 27.00%              | 50.0%              |
| 3      | 06/07/2020 | 68.65%              | 71.00%              | 50.0%              |
| 4      | 13/07/2020 | 92.66%              | 97.00%              | 50.0%              |
| 5      | 20/07/2020 | 100.00%             | 100.00%             | 50.0%              |
| 6      | 27/07/2020 | 100.00%             | 100.00%             | 50.0%              |
| 7      | 03/08/2020 | 100.00%             | 100.00%             | 100.0%             |

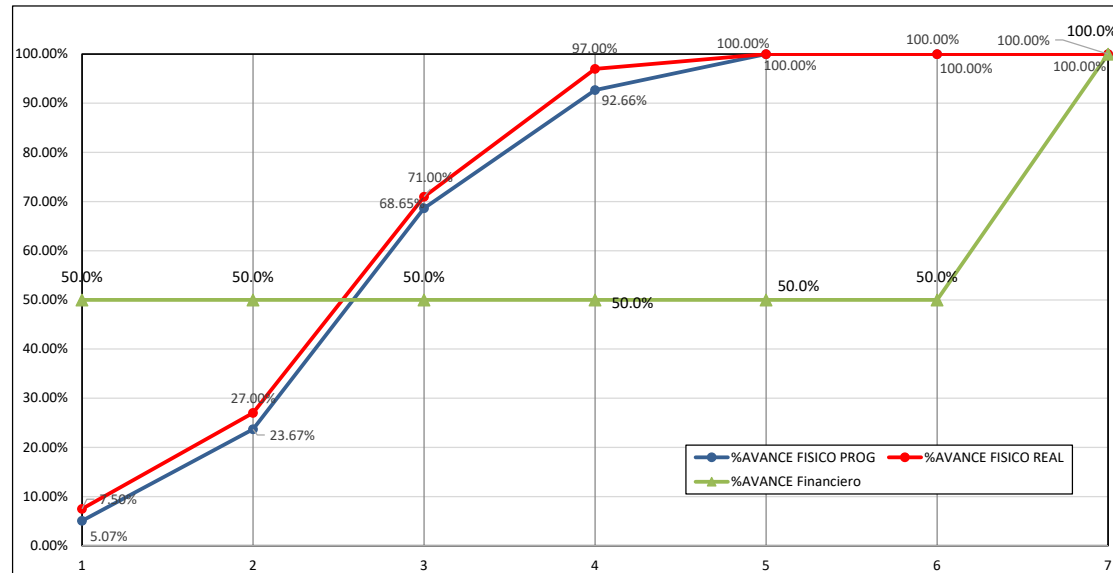

**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO**
