

GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA

Obra: Ubicación: IP 001/21 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, DE INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS

Tipo de inversión: TODO EL MUNICIPIO

Programa: INGRESOS PROPIOS 2021

Subprograma: U9 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO REGIONAL

Residente: 01, 03 ESTUDIOS Y PROYECTOS, SERVICIOS

Contrato: IP 001/21

Contratista: Ing. Ángel de Jesús Ramírez Guardado

Inicio Vigente: sábado, 13 de febrero de 2021

Inicio Real: sábado, 13 de febrero de 2021

Fin Vigente: jueves, 9 de diciembre de 2021


Fin Real: jueves, 9 de diciembre de 2021

Días de Obra: 299

Monto Contratado: \$ 199,990.00

Monto Ejercido:

SEMANA	FECHA	%AVANCE FISICO PROG	%AVANCE FISICO REAL	%AVANCE Financiero
1	15/02/2021	33.41%	35.00%	0.0%
2	01/03/2021	34.78%	37.00%	0.0%
3	15/03/2021	36.15%	38.00%	0.0%
4	29/03/2021	42.00%	40.00%	0.0%
5	12/04/2021	43.37%		
6	26/04/2021	44.74%		
7	10/05/2021	46.11%		
8	24/05/2021	50.00%		
9	07/06/2021	51.37%		
10	21/06/2021	52.74%		
11	05/07/2021	54.11%		
12	19/07/2021	55.48%		
13	02/08/2021	56.85%		
14	16/08/2021	58.22%		
15	30/08/2021	59.59%		
16	13/09/2021	60.96%		
17	27/09/2021	62.33%		
18	11/10/2021	63.70%		
19	25/10/2021	65.07%		
20	08/11/2021	66.44%		
21	22/11/2021	72.00%		
22	06/12/2021	89.00%		
23	20/12/2021	100.00%		

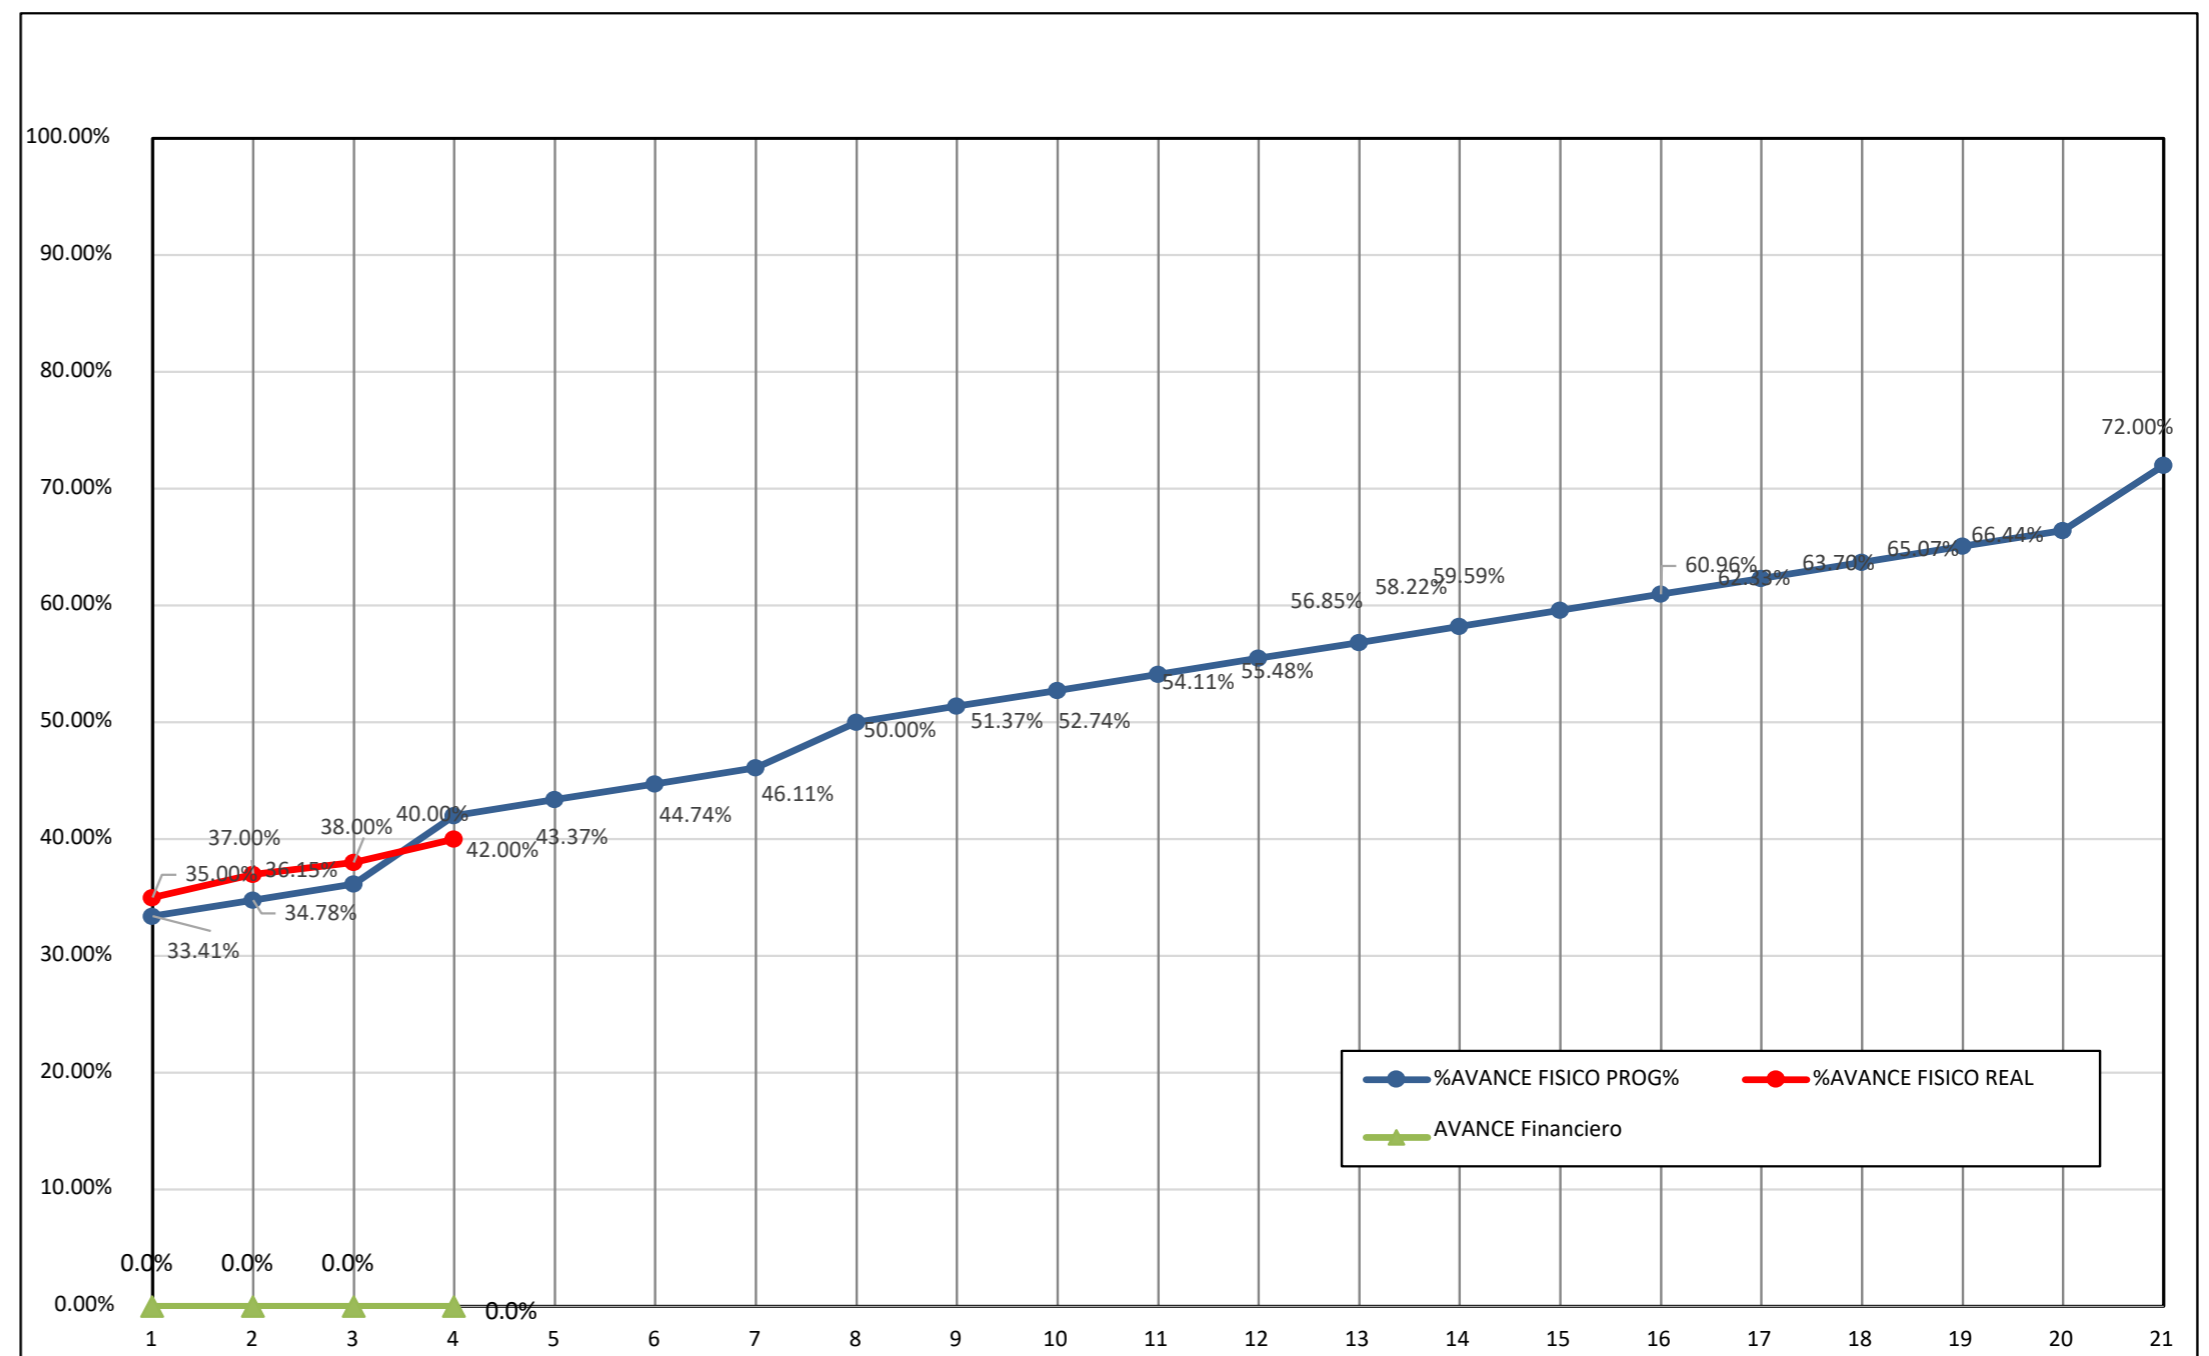

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
