

## GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA

**Obra:** FISMDF 11-001 REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CALLE NIÑOS HEROES TRAMO CALLE MATAMOROS A CALLE FRANCISCO JAVIER GUTIÉRREZ,  
FISMDF 11-002 REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, CALLE NIÑOS HEROES TRAMO CALLE MATAMOROS A CALLE FRANCISCO JAVIER GUTIÉRREZ

**Ubicación:** FRACC. LOS LIRIOS

**Contrato:** FISMDF 001-002/2021

**Tipo de inversión:** FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2021

**Contratista:** ARVIL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

**Programa:** SD ALCANTARILLADO, SC AGUA POTABLE

**Inicio Vigente:** jueves, 17 de junio de 2021

**Días de Obra:** 45 días

**Subprograma:** 01 REHABILITACIÓN

**Inicio Real:** jueves, 17 de junio de 2021

**Monto Contratado:**


**Residente:** T.C. FERNANDO LUNA MEDINA

**Fin Vigente:** sábado, 31 de julio de 2021

**Monto Ejercido:**

**Fin Real:**

SEMANA	FECHA	%AVANCE FISICO PROG	%AVANCE FISICO REAL	%AVANCE Financiero
1	21/06/2021	0.25%	2.00%	50.0%
2	28/06/2021	6.48%	8.00%	50.0%
3	05/07/2021	25.20%		
4	12/07/2021	44.13%		
5	19/07/2021	57.38%		
6	26/07/2021	79.49%		
7	02/08/2021	100.00%		

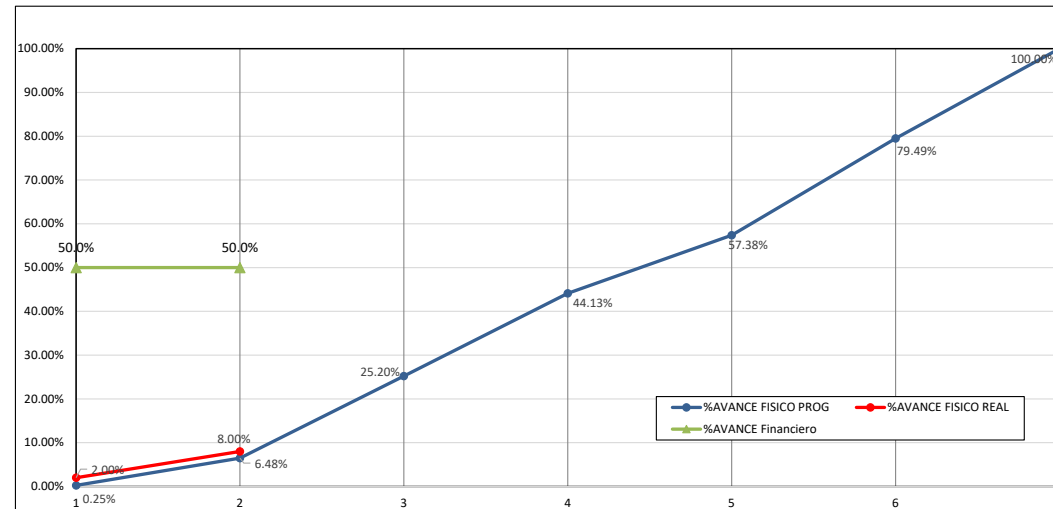

**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO**
