

## GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA

**Obra:** FISMDF 11-003 REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CALLE EMILIANO ZAPATA TRAMO CALLE FRANCISCO JAVIER GUTIERREZ Y CALLE MATAMOROS  
 FISMDF 11-004 REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, CALLE EMILIANO ZAPATA TRAMO CALLE FRANCISCO JAVIER GUTIERREZ Y CALLE MATAMOROS  
 FISMDF 11-020 REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CALLE LÁZARO CARDENAS, TRAMO CALLE GUADALUPE MELENDEZ A CALLE GUADALUPE VICTORIA  
 FISMDF 11-021 REHABILITACIÓN RED DE AGUA POTABLE CALLE LÁZARO CARDENAS, TRAMO CALLE GUADALUPE MELENDEZ A CALLE GUADALUPE VICTORIA

**Ubicación:** COL. CENTRO CABECERA MUNICIPAL y LORETITO, **Contrato:** FISMDF 003-004 y 020-021/2021

**Tipo de inversión:** FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2021 **Contratista:** LM4 POZOS Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.


**Programa:** SD ALCANTARILLADO, SC AGUA POTABLE **Inicio Vigente:** martes, 22 de junio de 2021 **Días de Obra:** 45 días

**Subprograma:** 01 REHABILITACIÓN **Inicio Real:** martes, 22 de junio de 2021 **Monto Contratado:** \$732,036.90

**Residente:** ING.CARLOS ARMANDO CHÁVEZ GARCÍA **Fin Vigente:** jueves, 5 de agosto de 2021 **Monto Ejercido:**

**Fin Real:**

SEMANA	FECHA	%AVANCE FISICO PROG	%AVANCE FISICO REAL	%AVANCE Financiero
1	28/06/2021	0.99%	2.00%	50.0%
2	05/07/2021	7.64%		
3	12/07/2021	23.11%		
4	19/07/2021	41.15%		
5	26/07/2021	68.32%		
6	02/08/2021	86.82%		
7	09/08/2021	100.00%		

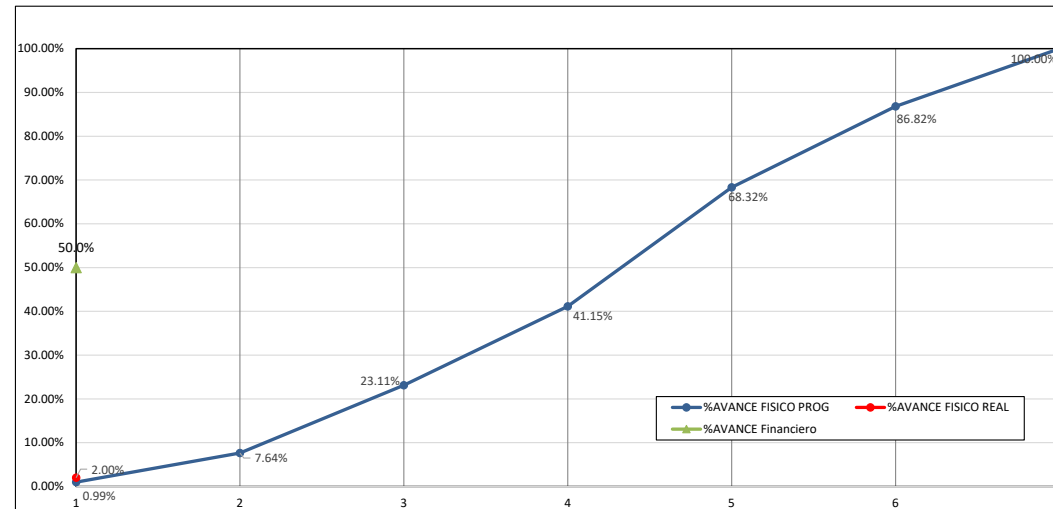

**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO**
