

## GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA

**Obra:** FISMDF 11-005 REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CALLE ROMO DE VIVAR, TRAMO CALLE MATAMOROS A CALLE FRANCISCO JAVIER GUTIÉRREZ  
 FISMDF 11-006 REHABILITACIÓN RED DE AGUA POTABLE, CALLE ROMO DE VIVAR, TRAMO CALLE MATAMOROS A CALLE FRANCISCO JAVIER GUTIÉRREZ

**Ubicación:** FRACC. LOS LIRIOS

**Contrato:** FISMDF 005-006/2021

**Tipo de inversión:** FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2021

**Contratista:** CORACO, S.A. DE C.V.

**Programa:** SD ALCANTARILLADO, SC AGUA POTABLE

**Inicio Vigente:** jueves, 10 de junio de 2021

**Días de Obra:** 45 días

**Subprograma:** 01 REHABILITACIÓN

**Inicio Real:** jueves, 10 de junio de 2021

**Monto Contratado:** \$1,038,953.92


**Residente:** T.C. FERNANDO LUNA MEDINA

**Fin Vigente:** sábado, 24 de julio de 2021

**Monto Ejercido:**

**Fin Real:**

SEMANA	FECHA	%AVANCE FISICO PROG	%AVANCE FISICO REAL	%AVANCE Financiero
1	14/06/2021	15.21%	18.00%	50.0%
2	21/06/2021	44.87%	50.00%	50.0%
3	28/06/2021	62.33%	64.00%	50.0%
4	05/07/2021	75.60%		
5	12/07/2021	82.50%		
6	19/07/2021	91.40%		
7	26/07/2021	100.00%		

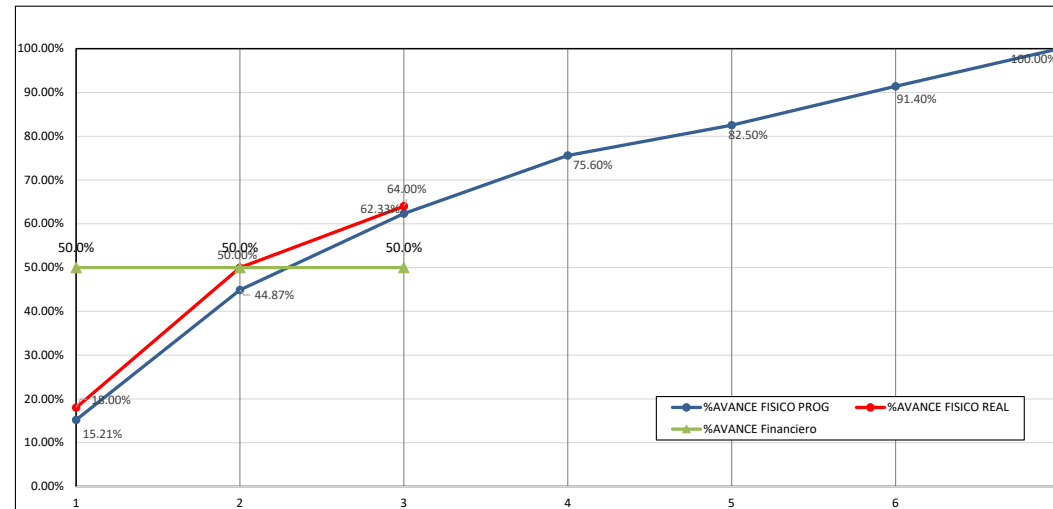

**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO**
